

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI
AREA DEL SUPPORTO E DEL COORDINAMENTO
CASELLA POSTALE 2170 - 6501 BELLINZONA


2763.402-3

Strada Cantonale – PA13
Magadino - Brissago
Comune di Ascona

Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona
Impianto di ventilazione
Opere di elettromeccanica

PROGRAMMA LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2022												2023												2024																																									
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott																																
					5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
1	Progetto di ventilazione	525 g	lun 18.07.22	ven 19.07.24																																																																		
2	Fase 41 - Procedura d'appalto	110 g	lun 18.07.22	ven 16.12.22																																																																		
3	Pubblicazione	0 g	lun 18.07.22	lun 18.07.22																																																																		
4	Elaborazione delle offerte	35 g	lun 18.07.22	ven 02.09.22																																																																		
5	Termine rientro domande ditte	0 g	ven 05.08.22	ven 05.08.22																																																																		
6	Risposte alle domande delle ditte	0 g	ven 12.08.22	ven 12.08.22																																																																		
7	Apertura offerte (DT) e consegna a progettista	0 g	ven 09.09.22	ven 09.09.22																																																																		
8	Valutazione offerte	25 g	lun 12.09.22	ven 14.10.22																																																																		
9	Delibera	0 g	ven 21.10.22	ven 21.10.22																																																																		
10	Periodo di ricorso	15 g	lun 24.10.22	ven 11.11.22																																																																		
11	Contratto	25 g	lun 14.11.22	ven 16.12.22																																																																		
12	Fase 51: Progetto esecutivo	260 g	ven 23.12.22	ven 22.12.23																																																																		
13	Consegna lavori	0 g	ven 23.12.22	ven 23.12.22																																																																		
14	Allestimento quaderno oneri	40 g	lun 26.12.22	ven 17.02.23																																																																		
15	Verifica quaderno oneri	25 g	lun 20.02.23	ven 24.03.23																																																																		
16	Chiusura quaderno d'oneri	15 g	lun 27.03.23	ven 14.04.23																																																																		
17	Approvazione quaderno oneri	0 g	ven 28.04.23	ven 28.04.23																																																																		
18	Comanda materiale e fabbricazione	32 s	lun 01.05.23	ven 08.12.23																																																																		
19	Collaudo in officina (FAT)	0 g	ven 15.12.23	ven 15.12.23																																																																		
20	Preparazione esecuzione	5 g	lun 18.12.23	ven 22.12.23																																																																		
21	Fase 52: Esecuzione	20 g	lun 25.12.23	ven 19.01.24																																																																		
22	Preparazione lavori	5 g	lun 25.12.23	ven 29.12.23																																																																		
23	Installazione Armadi e Cablaggio	15 g	lun 01.01.24	ven 19.01.24																																																																		
24	Installazione degli acceleratori nel vano traffico	15 g	lun 01.01.24	ven 19.01.24																																																																		
25	Fase 53: Messa in esercizio	130 g	lun 22.01.24	ven 19.07.24																																																																		
26	Test di funzionalità dell'impianto	5 g	lun 22.01.24	ven 26.01.24																																																																		
27	Messa in servizio acceleratori (SAT)	0 g	ven 02.02.24	ven 02.02.24																																																																		
28	Smantellamento vecchi acceleratori	5 g	lun 12.02.24	ven 16.02.24																																																																		
29	Periodo di prova	6 mes	lun 05.02.24	ven 19.07.24																																																																		
30	Collaudo provvisorio in sito	0 g	ven 19.07.24	ven 19.07.24																																																																		
31	Fase 53 - Messa in esercizio	55 g	lun 25.12.23	ven 08.03.24																																																																		
32	Elaborazione documentazione finale	25 g	lun 25.12.23	ven 26.01.24																																																																		
33	Verifica documentazione finale (Progettista UT IV)	15 g	lun 29.01.24	ven 16.02.24																																																																		
34	Elaborazione doc. finale definitiva	15 g	lun 19.02.24	ven 08.03.24																																																																		
35	Consegna documentazione finale	0 g	ven 08.03.24	ven 08.03.24																																																																		

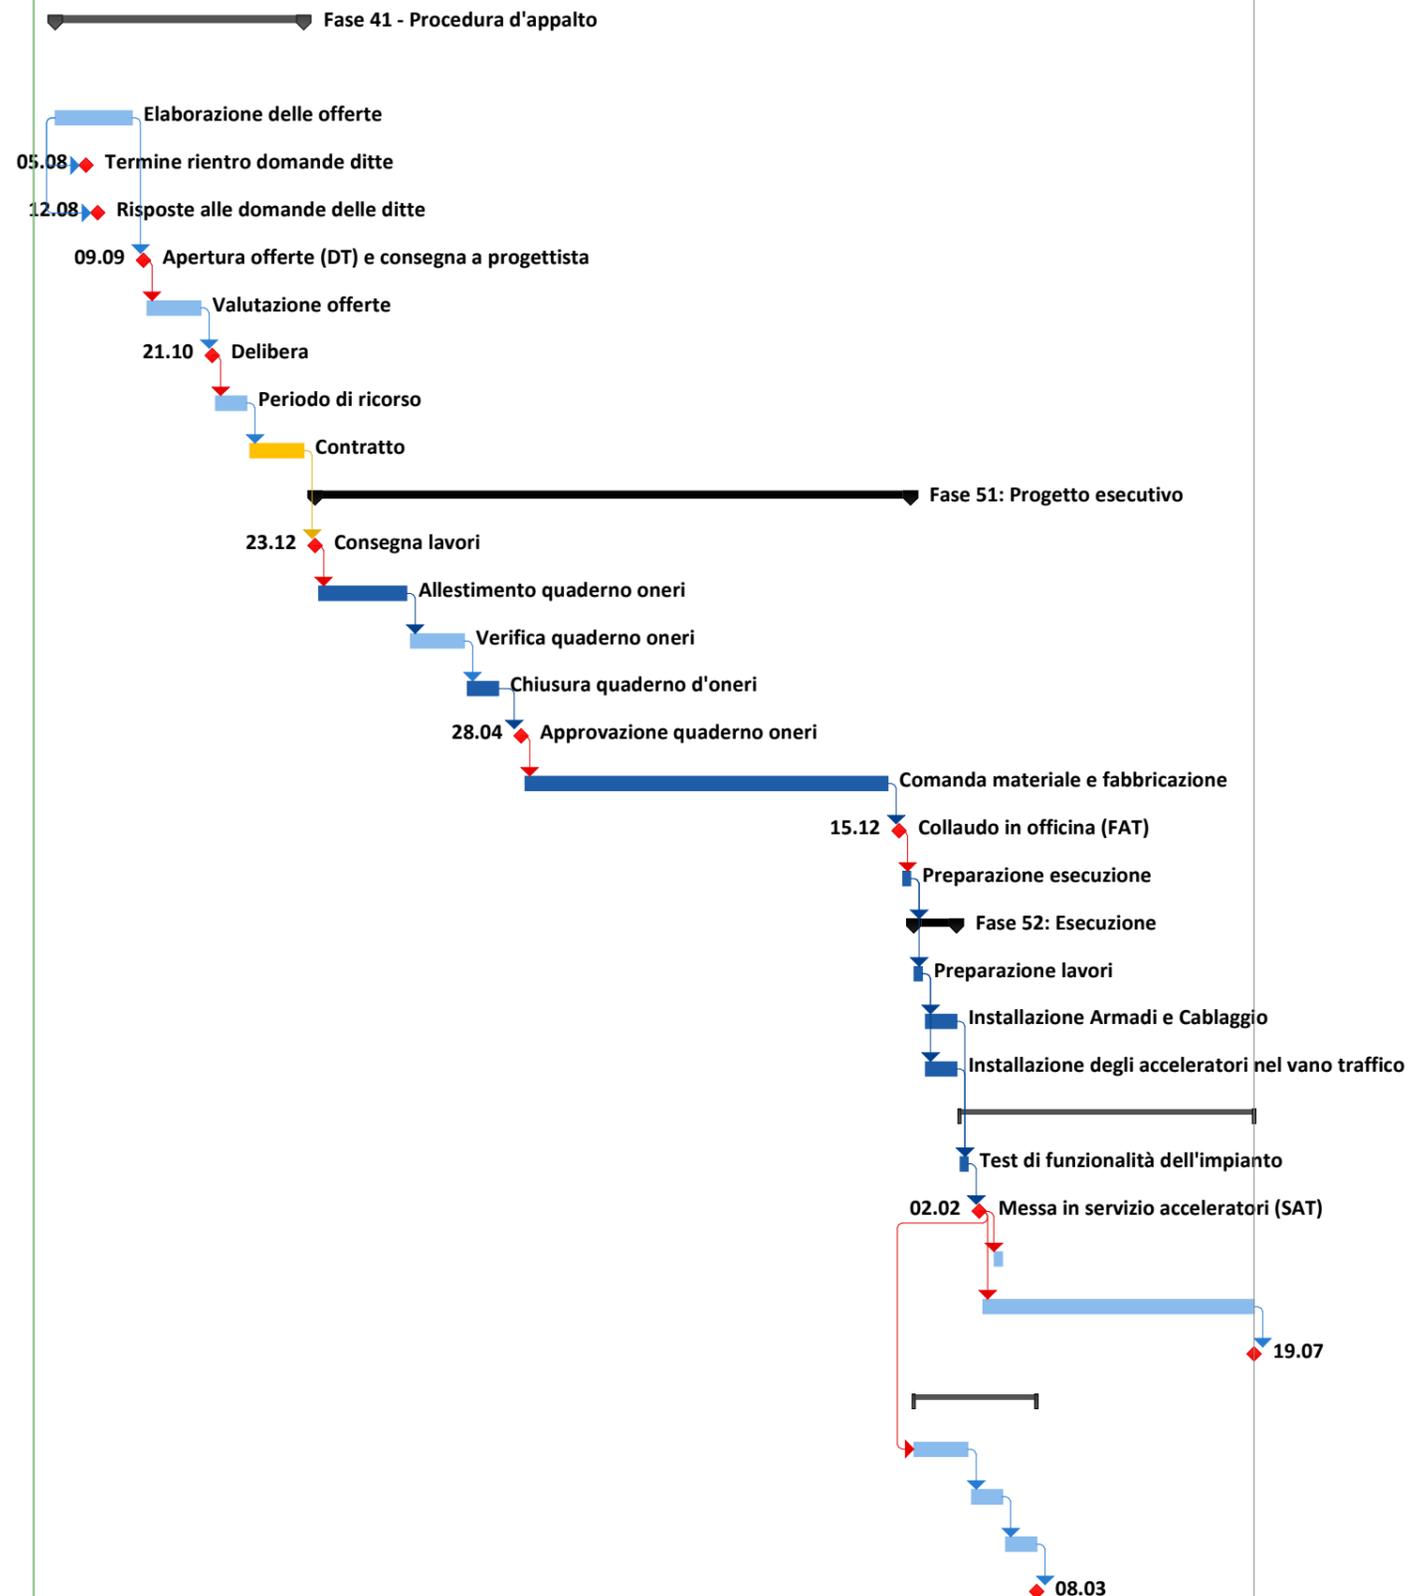

Progetto: 2020.0063.004-R-Piano_Termini.mpp
 Data: mar 05.07.22

Attività DT Attività LOSA Cardine Avanzamento manuale
 Attività Impresa Divisione Riepilogo
