



Spett.le

**am-t architettura sa**

Via A. Giovannini, 12

CH 6710

c.a. Arch. Massimo Ferrari

**Offerta nr.**

**PG 066/18 Rev. 1**

Data :

31. ottobre 2018

Telefono :

0041 91 880 08 00

Fax :

0041 91 880 08 01

**Concerne :** preventivo di spesa per noleggio, con durata 18 mesi, di n. 8 aule prefabbricate, **disposte su due livelli**, da installare presso la scuola media del **Comune di Acquarossa**.

Egregi Signori,

in seguito alla vostra gentile richiesta, abbiamo il piacere di sottoporvi la seguente offerta:

**Segue ns offerta PG 066/18 del 05 ottobre 2018**

**Soluzione C:** Impianto composto di 34 unità prefabbricate modulari.

Dettagli tecnici:

32 pz contenitori ad uso ufficio 20'

2 pz contenitori ad uso wc sanitario

2 pz scale d'accesso al piano primo

14 pz passerelle/ballatoio per accesso alle aule del piano primo

Vedi ns disegni allegati.

Versione:

\* Costruzione: montato

\* Altezza esterna 2800 mm

\* Altezza interna 2480 mm

Colore:

Esterno: RAL 9002 Bianco grigiastro

Rivestimento interno: bianco

Isolamento:

\* Isolamento pareti schiuma PIR 110 mm

\* Isolamento tetto schiuma PU 140 mm

\* Isolamento pavimento schiuma PU 100 mm


Elettricità:

\* Allacci elettrici con prese CEE incassate nel telaio, con quadro elettrico a norma CH (400V, 32A, 5 poli)

Costruzione pavimento:

\* Pavimento in cemento-legno

\* Rivestimento del pavimento alzato sulle pareti



# MACCHIMPORT

MACCHINE E UTENSILI PER L'EDILIZIA

"SURESTEP"

\* Rivestimento del pavimento "ETERNAL"

Equipaggiamento:

- \* Finestra da ufficio con apertura ad anta/ribalta e tapparella
- \* Altezza parapetto finestra ad uso sanitario: 1525mm dal pavimento
- \* Porta esterna in acciaio 1000mm  
Larghezza passaggio luce 936 mm
- \* Porta doppia 2000 mm (larghezza)  
Larghezza passaggio luce 1936 mm

Allestimenti per riscaldamento e areazione:

- \* Convettore elettrico 2 kW

**Il prezzo si intende senza prestazioni di montaggio e di fondamenta**

Prestazioni non incluse:

- \* calcolo del consumo energetico
- \* calcolo della statica e della sicurezza sismica

Canone di noleggio mensile: *CHF 11'100,-- + Iva 7,7%*

Durata minima di noleggio: 18 mesi

---

Totale costo di noleggio: *CHF 199'800,-- + Iva 7,7%*

**COSTI AGGIUNTIVI:**

Movimentazione moduli in uscita da deposito: *CHF 2'360,-- + Iva 7,7%*

Trasporto andata e scarico da ns camion: *CHF 19'600,-- + Iva 7,7%*

Trasporto ritorno e carico su ns camion: *CHF 19'600,-- + Iva 7,7%*

Movimentazione moduli in entrata nel deposito: *CHF 2'360,-- + Iva 7,7%*

Montaggio:

Preparazione, montaggio fino all'orlo dei container su superficie piana, ateriale per il montaggio, durata del viaggio e rimborso al chilometro per il personale del montaggio.

*CHF 26'500,-- + Iva 7,7%*

Smontaggio:


*CHF 21'000,-- + Iva 7,7%*

ESCLUSIONI:(a cura del cliente):

Autogru per lo scarico ed il posizionamento dei moduli in cantiere.

Preparazione per le basamenta

Messa in piano, allivellamento, fondamenta



# MACCHIMPORT

MACCHINE E UTENSILI PER L'EDILIZIA

Rete elettrica in cantiere  
Allacci idrici ed elettrici  
Autorizzazioni locali per la posa.  
Smaltimento rifiuti  
Calcoli di statica/antisismica/relazione legge 10  
Oneri per la sicurezza (documenti, noleggio di eventuali trabattelli, piattaforme aeree, etc.)  
Collegamento di rete di dati (telefoniche, internet, etc.)

I prezzi s'intendono senza IVA.

Termine di consegna:	da convenire
Cond. di consegna:	franco fabbrica Acquarossa, senza scarico
Modo di consegna:	camion
Termini di pagamento:	da convenire
Validità:	non vincolante fino ad ordine definitivo

Fatturazione minima: 18 mesi di nolo


I prezzi riportati si basano sul tasso attuale di cambio Euro/CHF pari a 1 Euro = 1,13990CHF.  
In caso di oscillazioni del tasso di cambio superiori al 5%, ci riserviamo il diritto di aumentare il prezzo in modo adeguato.

Eventuali riparazioni e/o pulizie de fine nolo necessarie verranno addebitate a restituzione effettuata.

RingraziandoVi per averci cortesemente interpellato, con l'occasione porgiamo distinti saluti



Pierluigi Giannotti  
Macchimport SA  
Mob. +41 79 211 53 29






# MACCHIMPORT

MACCHINE E UTENSILI PER L'EDILIZIA

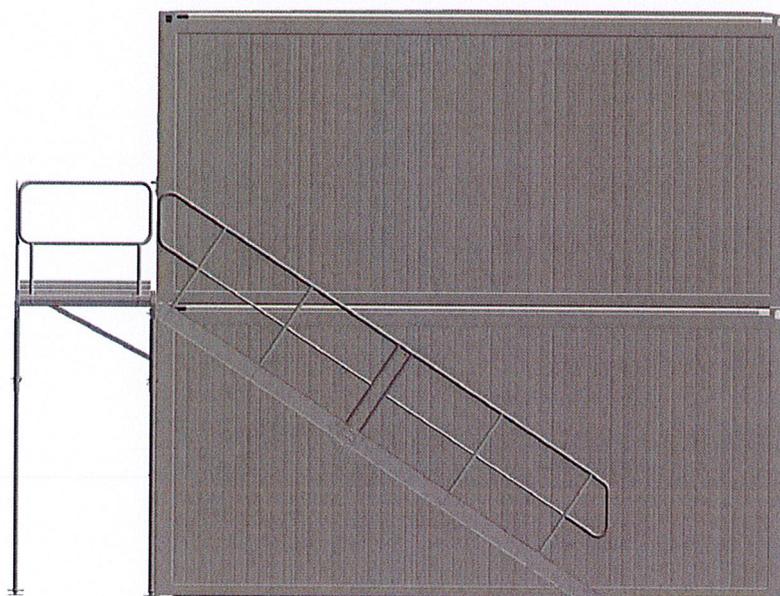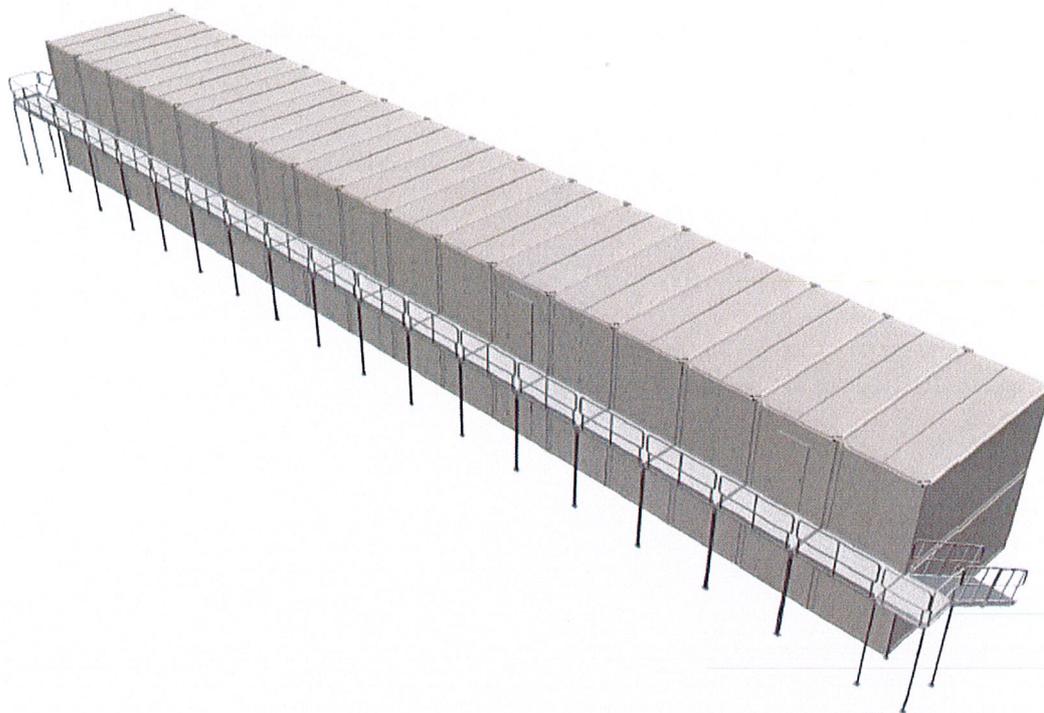

**Macchimport SA**

Via Maito 18 • CH-6804 Bironico • Tel. +41 91 936 12 00 • Fax +41 91 946 27 76  
info@macchimport.ch • www.macchimport.ch • Nr. IVA CHE-106.415.044



# MACCHIMPORT

MACCHINE E UTENSILI PER L'EDILIZIA



**Macchimport SA**

Via Maito 18 • CH-6804 Bironico • Tel. +41 91 936 12 00 • Fax +41 91 946 27 76  
info@macchimport.ch • www.macchimport.ch • Nr. IVA CHE-106.415.044
