# ALLEGATO ARCH2

Gianluca Martinelli
architetto
CP 265
6828 Balerna

tel 091 682 69 33
fax 091 682 69 34
mobile 079 543 45 44
info@studio-martinelli.ch

## Prog. Lavoro (cantiere) 12.11.19

Progetto: 49 [DL2], OSC Mottino
P. d'Opera: PG
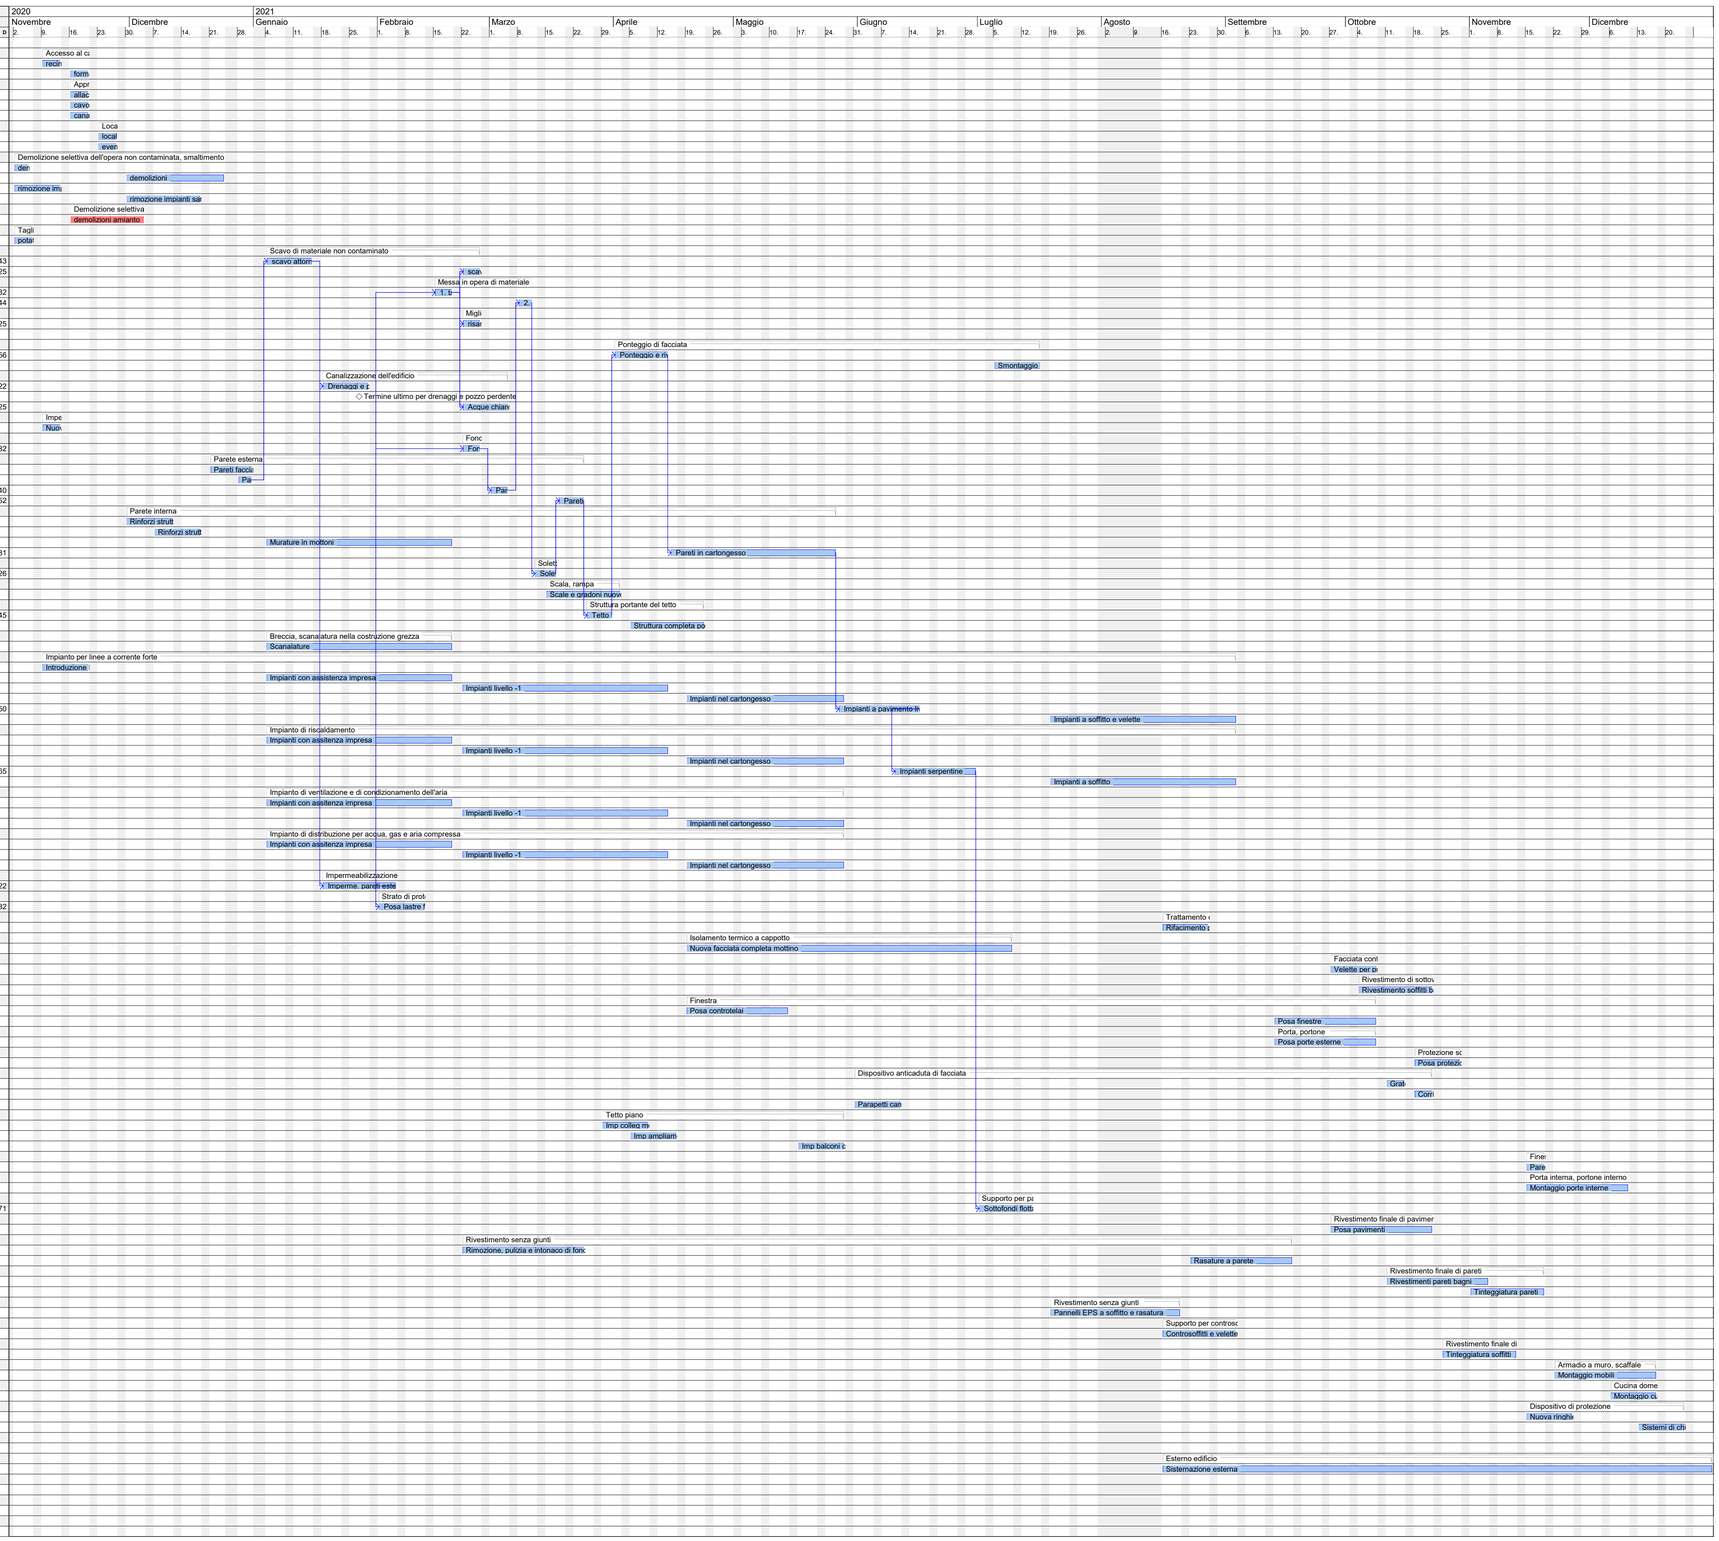
| eCCC-E | SDO | Designazione / Impreditore | Inizio | Fine | D | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | B 2.1 | **Accesso al cantiere** | 09.11.20 | 20.11.20 | **10** | |
| 3 | | *recinzioni* | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 | |
| 4 | | *formazione strade e piazzali* | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 | |
| 5 | B 2.2 | **Approvvigionamento, smaltimento** | 16.11.20 | 20.11.20 | **5** | |
| 6 | | *allacciamento acqua e elettricità cantiere* | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 | |
| 7 | | *cavo rete + eventuali (vedi specialisti)* | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 | |
| 8 | | *canalizzazioni* | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 | |
| 9 | B 2.3 | **Locale per il personale e trasporto di persone** | 23.11.20 | 27.11.20 | **5** | |
| 10 | | *locali e installazioni sanitarie* | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 | |
| 11 | | *eventuali* | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 | |
| 12 | B 5.1 | **Demolizione selettiva dell'opera non contaminata, smaltimento** | 02.11.20 | 24.12.20 | **39** | |
| 13 | | *demolizione muretti esterni* | 02.11.20 | 05.11.20 | 4 | |
| 14 | | *demolizioni* | 30.11.20 | 24.12.20 | 19 | |
| 15 | | *rimozione impianti elettrici esistenti* | 02.11.20 | 13.11.20 | 10 | |
| 16 | | *rimozione impianti san+riscaldamento esistenti* | 30.11.20 | 18.12.20 | 15 | |
| 17 | B 5.2 | **Demolizione selettiva dell'opera contaminata, smaltimento** | 16.11.20 | 04.12.20 | **15** | |
| 18 | | *demolizioni amianto* | 16.11.20 | 04.12.20 | 15 | |
| 19 | B 6.1 | **Taglio e sradicamento di alberi** | 02.11.20 | 06.11.20 | **5** | |
| 20 | | *potatura, protezione ed ev. taglio piante e arbusti* | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 | |
| 21 | B 6.2 | **Scavo di materiale non contaminato** | 04.01.21 | 26.02.21 | **40** | |
| 22 | | *scavo attorno alla costruzione, deposito e smaltimento* | 04.01.21 | 15.01.21 | 10 | 43 |
| 23 | | *scavi parziali ampliamenti* | 22.02.21 | 26.02.21 | 5 | 25 |
| 24 | B 6.6 | **Messa in opera di materiale** | 15.02.21 | 11.03.21 | **19** | |
| 25 | | *1. tappa riempimenti (fino a acque chiare)* | 15.02.21 | 19.02.21 | 5 | 82 |
| 26 | | *2. tappa riempimenti (fino a -30cm TS)* | 08.03.21 | 11.03.21 | 4 | 44 |
| 27 | B 7.1 | **Miglioramento del terreno di fondazione** | 22.02.21 | 26.02.21 | **5** | |
| 28 | | *risanamento fondazioni nuovi corpi* | 22.02.21 | 26.02.21 | 5 | 25 |
| 29 | B 8 | **Ponteggio** | | | | |
| 30 | B 8.1 | **Ponteggio di facciata** | 01.04.21 | 16.07.21 | **77** | |
| 31 | | *Ponteggio e rivestimento* | 01.04.21 | 14.04.21 | 10 | 56 |
| 32 | | *Smontaggio* | 05.07.21 | 16.07.21 | 10 | |
| 33 | C 1.1 | **Canalizzazione dell'edificio** | 18.01.21 | 05.03.21 | **35** | |
| 34 | | *Drenaggi e pozzo perdente* | 18.01.21 | 29.01.21 | 10 | 22 |
| 35 | | *Termine ultimo per drenaggi e pozzo perdente* | 27.01.21 | | | |
| 36 | | *Acque chiare e sporche* | 22.02.21 | 05.03.21 | 10 | 25 |
| 37 | C 1.2 | **Impermeabilizzazione, isolamento della platea** | 09.11.20 | 13.11.20 | **5** | |
| 38 | | *Nuovo pavimetto magazzino* | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 | |
| 39 | C 1.3 | **Fondazione singola, fondazione continua** | 22.02.21 | 26.02.21 | **5** | |
| 40 | | *Fondazione ampliamento camere* | 22.02.21 | 26.02.21 | 5 | 82 |
| 41 | C 2.1 | **Parete esterna** | 21.12.20 | 24.03.21 | **66** | |
| 42 | | *Pareti facciata* | 21.12.20 | 31.12.20 | 8 | |
| 43 | | *Parapetti provvisori* | 28.12.20 | 31.12.20 | 4 | |
| 44 | | *Pareti zoccolo ampliamento camere* | 01.03.21 | 05.03.21 | 5 | 40 |
| 45 | | *Pareti calcestruzzo ampliamento camere* | 18.03.21 | 24.03.21 | 5 | 52 |
| 46 | C 2.2 | **Parete interna** | 30.11.20 | 26.05.21 | **126** | |
| 47 | | *Rinforzi strutturali livello -1* | 30.11.20 | 11.12.20 | 10 | |
| 48 | | *Rinforzi strutturali livello 0* | 07.12.20 | 18.12.20 | 10 | |
| 49 | | *Murature in mattoni* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 50 | | *Pareti in cartongesso* | 15.04.21 | 26.05.21 | 30 | 31 |
| 51 | C 4.1 | **Soletta** | 12.03.21 | 17.03.21 | **4** | |
| 52 | | *Soletta ampliamento camere* | 12.03.21 | 17.03.21 | 4 | 26 |
| 53 | C 4.2 | **Scala, rampa** | 15.03.21 | 02.04.21 | **15** | |
| 54 | | *Scale e gradoni nuovo portico ingresso* | 15.03.21 | 02.04.21 | 15 | |
| 55 | C 4.4 | **Struttura portante del tetto** | 25.03.21 | 23.04.21 | **22** | |
| 56 | | *Tetto ampliamento camere* | 25.03.21 | 31.03.21 | 5 | 45 |
| 57 | | *Struttura completa portico nuovo ingresso* | 05.04.21 | 23.04.21 | 15 | |
| 58 | C 5.1 | **Breccia, scanalatura nella costruzione grezza** | 04.01.21 | 19.02.21 | **35** | |
| 59 | | *Scanalature* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 60 | D 1.2 | **Impianto per linee a corrente forte** | 09.11.20 | 03.09.21 | **203** | |
| 61 | | *Introduzione linee* | 09.11.20 | 20.11.20 | 10 | |
| 62 | | *Impianti con assistenza impresa* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 63 | | *Impianti livello -1* | 22.02.21 | 14.04.21 | 38 | |
| 64 | | *Impianti nel cartongesso* | 19.04.21 | 28.05.21 | 30 | |
| 65 | | *Impianti a pavimento livello 0* | 27.05.21 | 16.06.21 | 15 | 50 |
| 66 | | *Impianti a soffitto e velette* | 19.07.21 | 03.09.21 | 25 | |
| 67 | D 5 | **Impianto di riscaldamento** | 04.01.21 | 03.09.21 | **165** | |
| 68 | | *Impianti con assistenza impresa* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 69 | | *Impianti livello -1* | 22.02.21 | 14.04.21 | 38 | |
| 70 | | *Impianti nel cartongesso* | 19.04.21 | 28.05.21 | 30 | |
| 71 | | *Impianti serpentine* | 10.06.21 | 30.06.21 | 15 | 65 |
| 72 | | *Impianti a soffitto* | 19.07.21 | 03.09.21 | 25 | |
| 73 | D 7 | **Impianto di ventilazione e di condizionamento dell'aria** | 04.01.21 | 28.05.21 | **105** | |
| 74 | | *Impianti con assistenza impresa* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 75 | | *Impianti livello -1* | 22.02.21 | 14.04.21 | 38 | |
| 76 | | *Impianti nel cartongesso* | 19.04.21 | 28.05.21 | 30 | |
| 77 | D 8 | **Impianto di distribuzione per acqua, gas e aria compressa** | 04.01.21 | 28.05.21 | **105** | |
| 78 | | *Impianti con assistenza impresa* | 04.01.21 | 19.02.21 | 35 | |
| 79 | | *Impianti livello -1* | 22.02.21 | 14.04.21 | 38 | |
| 80 | | *Impianti nel cartongesso* | 19.04.21 | 28.05.21 | 30 | |
| 81 | E 1.1 | **Impermeabilizzazione, rivestimento terra** | 18.01.21 | 05.02.21 | **15** | |
| 82 | | *Impermeab. pareti esterne livello -1* | 18.01.21 | 05.02.21 | 15 | 22 |
| 83 | E 1.3 | **Strato di protezione contro terra** | 01.02.21 | 12.02.21 | **10** | |
| 84 | | *Posa lastre filtranti* | 01.02.21 | 12.02.21 | 10 | 82 |
| 85 | E 2.1 | **Trattamento di superficie, intonaco esterno** | 16.08.21 | 27.08.21 | **10** | |
| 86 | | *Rifacimento parziale intonaco facciata Motto* | 16.08.21 | 27.08.21 | 10 | |
| 87 | E 2.2 | **Isolamento termico a cappotto** | 19.04.21 | 09.07.21 | **60** | |
| 88 | | *Nuova facciata completa mottino* | 19.04.21 | 09.07.21 | 60 | |
| 89 | E 2.4 | **Facciata continua** | 27.09.21 | 08.10.21 | **10** | |
| 90 | | *Velette per protezioni solari* | 27.09.21 | 08.10.21 | 10 | |
| 91 | E 2.5 | **Rivestimento di sottovoliste** | 04.10.21 | 22.10.21 | **15** | |
| 92 | | *Rivestimento soffitti balconi camere* | 04.10.21 | 22.10.21 | 15 | |
| 93 | E 3.1 | **Finestra** | 19.04.21 | 08.10.21 | **115** | |
| 94 | | *Posa controtelai* | 19.04.21 | 14.05.21 | 20 | |
| 95 | | *Posa finestre* | 13.09.21 | 08.10.21 | 20 | |
| 96 | E 3.2 | **Porta, portone** | 13.09.21 | 08.10.21 | **20** | |
| 97 | | *Posa porte esterne* | 13.09.21 | 08.10.21 | 20 | |
| 98 | E 3.3 | **Protezione solare** | 18.10.21 | 29.10.21 | **10** | |
| 99 | | *Posa protezioni solari* | 18.10.21 | 29.10.21 | 10 | |
| 100 | E 3.4 | **Dispositivo anticaduta di facciata** | 31.05.21 | 22.10.21 | **95** | |
| 101 | | *Grate* | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 | |
| 102 | | *Corrimani* | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 | |
| 103 | | *Parapetti camere* | 31.05.21 | 11.06.21 | 10 | |
| 104 | F 1.2 | **Tetto piano** | 29.03.21 | 28.05.21 | **45** | |
| 105 | | *Imp collegamento/mottino* | 29.03.21 | 09.04.21 | 10 | |
| 106 | | *Imp ampliamento camere* | 05.04.21 | 16.04.21 | 10 | |
| 107 | | *Imp balconi camere* | 17.05.21 | 28.05.21 | 10 | |
| 108 | G 1.3 | **Finestra interna** | 15.11.21 | 19.11.21 | **5** | |
| 109 | | *Pareti divisorie in vetro* | 15.11.21 | 19.11.21 | 5 | |
| 110 | G 1.4 | **Porta interna, portone interno** | 15.11.21 | 10.12.21 | **20** | |
| 111 | | *Montaggio porte interne* | 15.11.21 | 10.12.21 | 20 | |
| 112 | G 2.2 | **Supporto per pavimenti** | 01.07.21 | 14.07.21 | **10** | |
| 113 | | *Sottofondi flottanti* | 01.07.21 | 14.07.21 | 10 | 71 |
| 114 | G 2.3 | **Rivestimento finale di pavimenti** | 27.09.21 | 22.10.21 | **20** | |
| 115 | | *Posa pavimenti* | 27.09.21 | 22.10.21 | 20 | |
| 116 | G 3.1 | **Rivestimento senza giunti** | 22.02.21 | 17.09.21 | **140** | |
| 117 | | *Rimozione, pulizia e intonaco di fondo* | 22.02.21 | 24.03.21 | 23 | |
| 118 | | *Rasature a parete* | 23.08.21 | 17.09.21 | 20 | |
| 119 | G 3.3 | **Rivestimento finale di pareti** | 11.10.21 | 19.11.21 | **30** | |
| 120 | | *Rivestimenti pareti bagni* | 11.10.21 | 05.11.21 | 20 | |
| 121 | | *Tinteggiatura pareti* | 01.11.21 | 19.11.21 | 15 | |
| 122 | G 4.1 | **Rivestimento senza giunti** | 19.07.21 | 20.08.21 | **15** | |
| 123 | | *Pannelli EPS a soffitto e rasatura* | 19.07.21 | 20.08.21 | 15 | |
| 124 | G 4.2 | **Supporto per controsoffitti** | 16.08.21 | 03.09.21 | **15** | |
| 125 | | *Controsoffitti e velette + lisciatura* | 16.08.21 | 03.09.21 | 15 | |
| 126 | G 4.3 | **Rivestimento finale di soffitti** | 25.10.21 | 12.11.21 | **15** | |
| 127 | | *Tinteggiatura soffitti* | 25.10.21 | 12.11.21 | 15 | |
| 128 | G 5.1 | **Armadio a muro, scaffale** | 22.11.21 | 17.12.21 | **20** | |
| 129 | | *Montaggio mobili* | 22.11.21 | 17.12.21 | 20 | |
| 130 | G 5.2 | **Cucina domestica** | 06.12.21 | 17.12.21 | **10** | |
| 131 | | *Montaggio cucine* | 06.12.21 | 17.12.21 | 10 | |
| 132 | G 5.4 | **Dispositivo di protezione** | 15.11.21 | 24.12.21 | **30** | |
| 133 | | *Nuova ringhiera scala interna* | 15.11.21 | 26.11.21 | 10 | |
| 134 | | *Sistemi di chiusura* | 13.12.21 | 24.12.21 | 10 | |
| 135 | G 6.3 | **Pulizia** | | | | |
| 136 | | *Lavoro 1* | | | | |
| 137 | I | **Esterno edificio** | 16.08.21 | 31.12.21 | **100** | |
| 138 | | *Sistemazione esterna* | 16.08.21 | 31.12.21 | 100 | |
| 139 | J 1.1 | **Mobilio generico** | | | | |
| 140 | | *Lavoro 1* | | | | |
| 141 | J 1.4 | **Segnaletica** | | | | |
| 142 | | *Lavoro 1* | | | | |
| 143 | J 4.2 | **Opera d'arte incorporata** | | | | |
| 144 | | *Lavoro 1* | | | | |
