ID	Nome attività	Inizio	Fine	Inizio ultimo
1	**RIMOZIONE AMIANTO**	**lun 02.10.23**	**ven 09.08.24**	**lun 02.10.23**
2	Tappa 1	lun 02.10.23	lun 13.11.23	lun 02.10.23
3	Tappa 2	mar 02.07.24	ven 09.08.24	mar 02.07.24
4				
5	**IMPRESA**	**lun 02.10.23**	**ven 29.11.24**	**lun 13.11.23**
6	Impianto di cantiere, area di accesso, recinzione di cantiere, platea gru	**lun 02.10.23**	gio 26.10.23	ven 03.01.25
7	coperture e protezioni varie / sondaggi Tappa1	lun 13.11.23	ven 24.11.23	gio 30.01.25
8	posizionamento gru	ven 03.11.23	ven 10.11.23	gio 06.02.25
9	montaggio ponteggio per serramenti mensa	lun 16.10.23	ven 20.10.23	lun 23.12.24
10	Preparazione uscite per movimentazione materiale / con scavo esterno	gio 02.11.23	lun 13.11.23	lun 03.02.25
11	coperture e protezioni varie / sondaggi Tappa 2	mer 12.06.24	mar 02.07.24	mer 12.06.24
12	passerella esterna	mar 22.10.24	ven 29.11.24	ven 03.01.25
13				
14	**Smontaggio e demolizione camera tipo: 2 giorni a camera 2 persone**	**lun 13.11.23**	**mer 18.09.24**	**lun 13.11.23**
15	Tappa 1 su due livelli	lun 13.11.23	mar 23.01.24	lun 13.11.23
16	Taglio ascensore	lun 20.11.23	lun 27.11.23	lun 02.12.24
17	Tappa 2 su due livelli	ven 09.08.24	mer 18.09.24	ven 09.08.24
18				
19	**Assistenze - ricostruzioni : 3 giorni a camera impresa per assistenza**	**ven 01.12.23**	**mar 22.10.24**	**ven 01.12.23**
20	Tappa 1 su due livelli	ven 01.12.23	ven 16.02.24	ven 01.12.23
21	Tappa 2 su due livelli	gio 29.08.24	mar 22.10.24	gio 29.08.24
22				
23	**PONTEGGIO**	**lun 02.10.23**	**mar 18.06.24**	**ven 01.11.24**
24	Posa ponteggio tappa 1 esterno	lun 16.10.23	ven 20.10.23	lun 23.12.24
25	Posa ponteggio vano scale p	lun 02.10.23	mar 03.10.23	lun 10.02.25
26	Posa ponteggio tappa 2 esterno + somntaggio Tappa 1	mer 12.06.24	mar 18.06.24	ven 01.11.24
27				
28	**ASCENSORE**	**mar 16.08.22**	**mar 27.02.24**	**ven 22.11.24**
29	rimozione vecchio ascensore + montacarichi	lun 13.11.23	lun 20.11.23	ven 22.11.24
30	rilievo	lun 27.11.23	mar 28.11.23	lun 09.12.24
31	forniture e posa nuovo ascensore	mer 14.02.24	mar 27.02.24	gio 30.01.25
32		mar 16.08.22	mar 16.08.22	gio 13.02.25
33	**OPERE DA ELETTRICISTA**	**lun 02.10.23**	**gio 02.01.25**	**lun 23.12.24**
34	distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 1	lun 02.10.23	ven 06.10.23	gio 30.01.25
35	distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 2	mer 12.06.24	mar 18.06.24	gio 30.01.25
36	Tracciamento impianti	lun 13.11.23	ven 17.11.23	gio 06.02.25
37	Tracciamento impianti Tappa 2	ven 09.08.24	ven 16.08.24	gio 06.02.25
38	allestimento impianti Tappa 1	ven 01.12.23	ven 16.02.24	lun 23.12.24
39	allestimento impianti Tappa 2	gio 29.08.24	mar 15.10.24	lun 30.12.24
40	Posa tappa 1	mar 02.04.24	lun 06.05.24	ven 10.01.25
41	Posa tappa 2	lun 02.12.24	gio 02.01.25	ven 10.01.25
42				
43	**OPERE DA IMPIANTI RVS**	**lun 02.10.23**	**gio 23.01.25**	**lun 22.04.24**
44	distacco e messa in sicurezza impianti	lun 02.10.23	ven 06.10.23	gio 30.01.25
45	distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 2	mer 12.06.24	mar 18.06.24	gio 30.01.25
46	Rimozione sanitari e installazioni nei servizi Tappa 1	lun 02.10.23	ven 13.10.23	gio 30.01.25
47	Rimozione sanitari e installazioni nei servizi Tappa 2	mer 12.06.24	mar 25.06.24	gio 30.01.25
48	Tracciamento impianti 1	lun 13.11.23	ven 17.11.23	gio 06.02.25
49	Tracciamento impianti 2	ven 09.08.24	ven 16.08.24	gio 06.02.25
50	allestimento impianti Tappa 1	ven 01.12.23	ven 16.02.24	lun 23.12.24
51	allestimento impianti Tappa 2	gio 29.08.24	mar 15.10.24	lun 30.12.24
52	Posa tappa 1	lun 22.04.24	mer 05.06.24	lun 22.04.24
53	Posa tappa 2	ven 20.12.24	gio 23.01.25	ven 10.01.25
54				
55	**METALCOSTRUTTORE - SERRAMENTI**	**mar 03.10.23**	**lun 09.12.24**	**mar 27.08.24**
56	**Tappa 1**	**mar 03.10.23**	**gio 04.04.24**	**mar 27.08.24**
57	adeguamento parapetti interni x scala provvisoria	mar 03.10.23	mer 04.10.23	mer 12.02.25
58	smontaggio vetri	lun 13.11.23	ven 01.12.23	mar 27.08.24
59	rilievo vetri e ordinazione vetri facciate esterne (tempo fornitura 10 settimane)	ven 17.11.23	gio 23.11.23	mar 03.09.24
60	posa serramenti e vetri (compresa scala)	gio 07.03.24	gio 04.04.24	mar 26.11.24
61	adeguamento parapetti interni edificio tappa 1	gio 07.03.24	mer 13.03.24	gio 06.02.25
62	**Tappa 2**	**mar 18.06.24**	**lun 09.12.24**	**ven 08.11.24**
68				
69	**BETONCINI (presa rapida)**	**ven 22.03.24**	**lun 02.12.24**	**ven 22.03.24**
70	Tappa 1	ven 22.03.24	mar 02.04.24	ven 22.03.24
71	Tappa 2	ven 22.11.24	lun 02.12.24	ven 22.11.24
72				
73	**GESSATORE**	**ven 16.02.24**	**gio 26.12.24**	**ven 16.02.24**
74	**Pareti**	**ven 16.02.24**	**ven 29.11.24**	**ven 16.02.24**
75	Tappa 1 su due livelli	ven 16.02.24	ven 29.03.24	ven 16.02.24
76	Tappa 2	mar 22.10.24	ven 29.11.24	mar 22.10.24
77	**Soffitti**	**ven 29.03.24**	**gio 26.12.24**	**ven 17.01.25**
78	Tappa 1 su due livelli	ven 29.03.24	gio 25.04.24	ven 17.01.25
79	Tappa 2	ven 29.11.24	gio 26.12.24	ven 17.01.25
80				
81	**PIASTRELLISTA**	**mar 02.04.24**	**gio 16.01.25**	**mar 02.04.24**
82	Tappa 1	mar 02.04.24	mer 22.05.24	mar 02.04.24
83	Tappa 2	lun 02.12.24	gio 16.01.25	lun 02.12.24
84				
85	**FALEGNAME**	**mar 29.08.23**	**gio 23.01.25**	**mar 26.11.24**
86	**Tappa 1**	**lun 18.12.23**	**mer 22.05.24**	**mar 26.11.24**
87	rilievo porte interne	lun 18.12.23	mar 19.12.23	mar 26.11.24
88	posa porte interne	ven 26.04.24	mer 22.05.24	ven 24.01.25
89	rilievo arredi interni	lun 18.12.23	gio 21.12.23	mar 26.11.24
90	posa arredi interni	ven 23.02.24	ven 29.03.24	ven 10.01.25
91	**Tappa 2**	**mar 29.08.23**	**gio 23.01.25**	**ven 27.12.24**
96				
97	**PITTORE ESTERNO**	**ven 20.10.23**	**ven 04.10.24**	**mer 06.11.24**
98	**Tappa 1**	**ven 20.10.23**	**gio 25.04.24**	**mer 06.11.24**
99	Lavaggio e preparazione facciate esterne	ven 20.10.23	gio 07.12.23	lun 30.12.24
100	Preparazione logge: carteggiatura, verniciatiatura : calcolato 3 giorni di lavoro a loggia da	ven 16.02.24	gio 04.04.24	mer 06.11.24
101	Velatura pareti esterne facciate esterne	gio 04.04.24	gio 25.04.24	ven 24.01.25
102	Prepazione facciate interne corte	gio 22.02.24	gio 07.03.24	ven 17.01.25
103	Preparazione parti metalliche interne	gio 07.03.24	gio 21.03.24	gio 30.01.25
104	Verniciatura facciate interne corte	gio 07.03.24	gio 21.03.24	gio 30.01.25
105	**Tappa 2**	**mar 18.06.24**	**ven 04.10.24**	**lun 30.12.24**
108				
109	**PITTORE INTERNO**	**gio 04.04.24**	**gio 06.02.25**	**lun 23.12.24**
110	**Tappa 1**	**gio 04.04.24**	**lun 03.06.24**	**lun 23.12.24**
111	verniciatura e tinteggio generali	gio 25.04.24	lun 03.06.24	ven 10.01.25
112	Verniciatura parti metalliche interne	gio 04.04.24	gio 25.04.24	lun 23.12.24
113	**Tappa 2**	**gio 09.01.25**	**gio 06.02.25**	**gio 09.01.25**
116				
117	**Pulizie**	**mer 05.06.24**	**gio 13.02.25**	**mer 05.06.24**
118	Tappa 1	mer 05.06.24	mer 12.06.24	mer 05.06.24
119	Tappa 2	gio 06.02.25	gio 13.02.25	gio 06.02.25

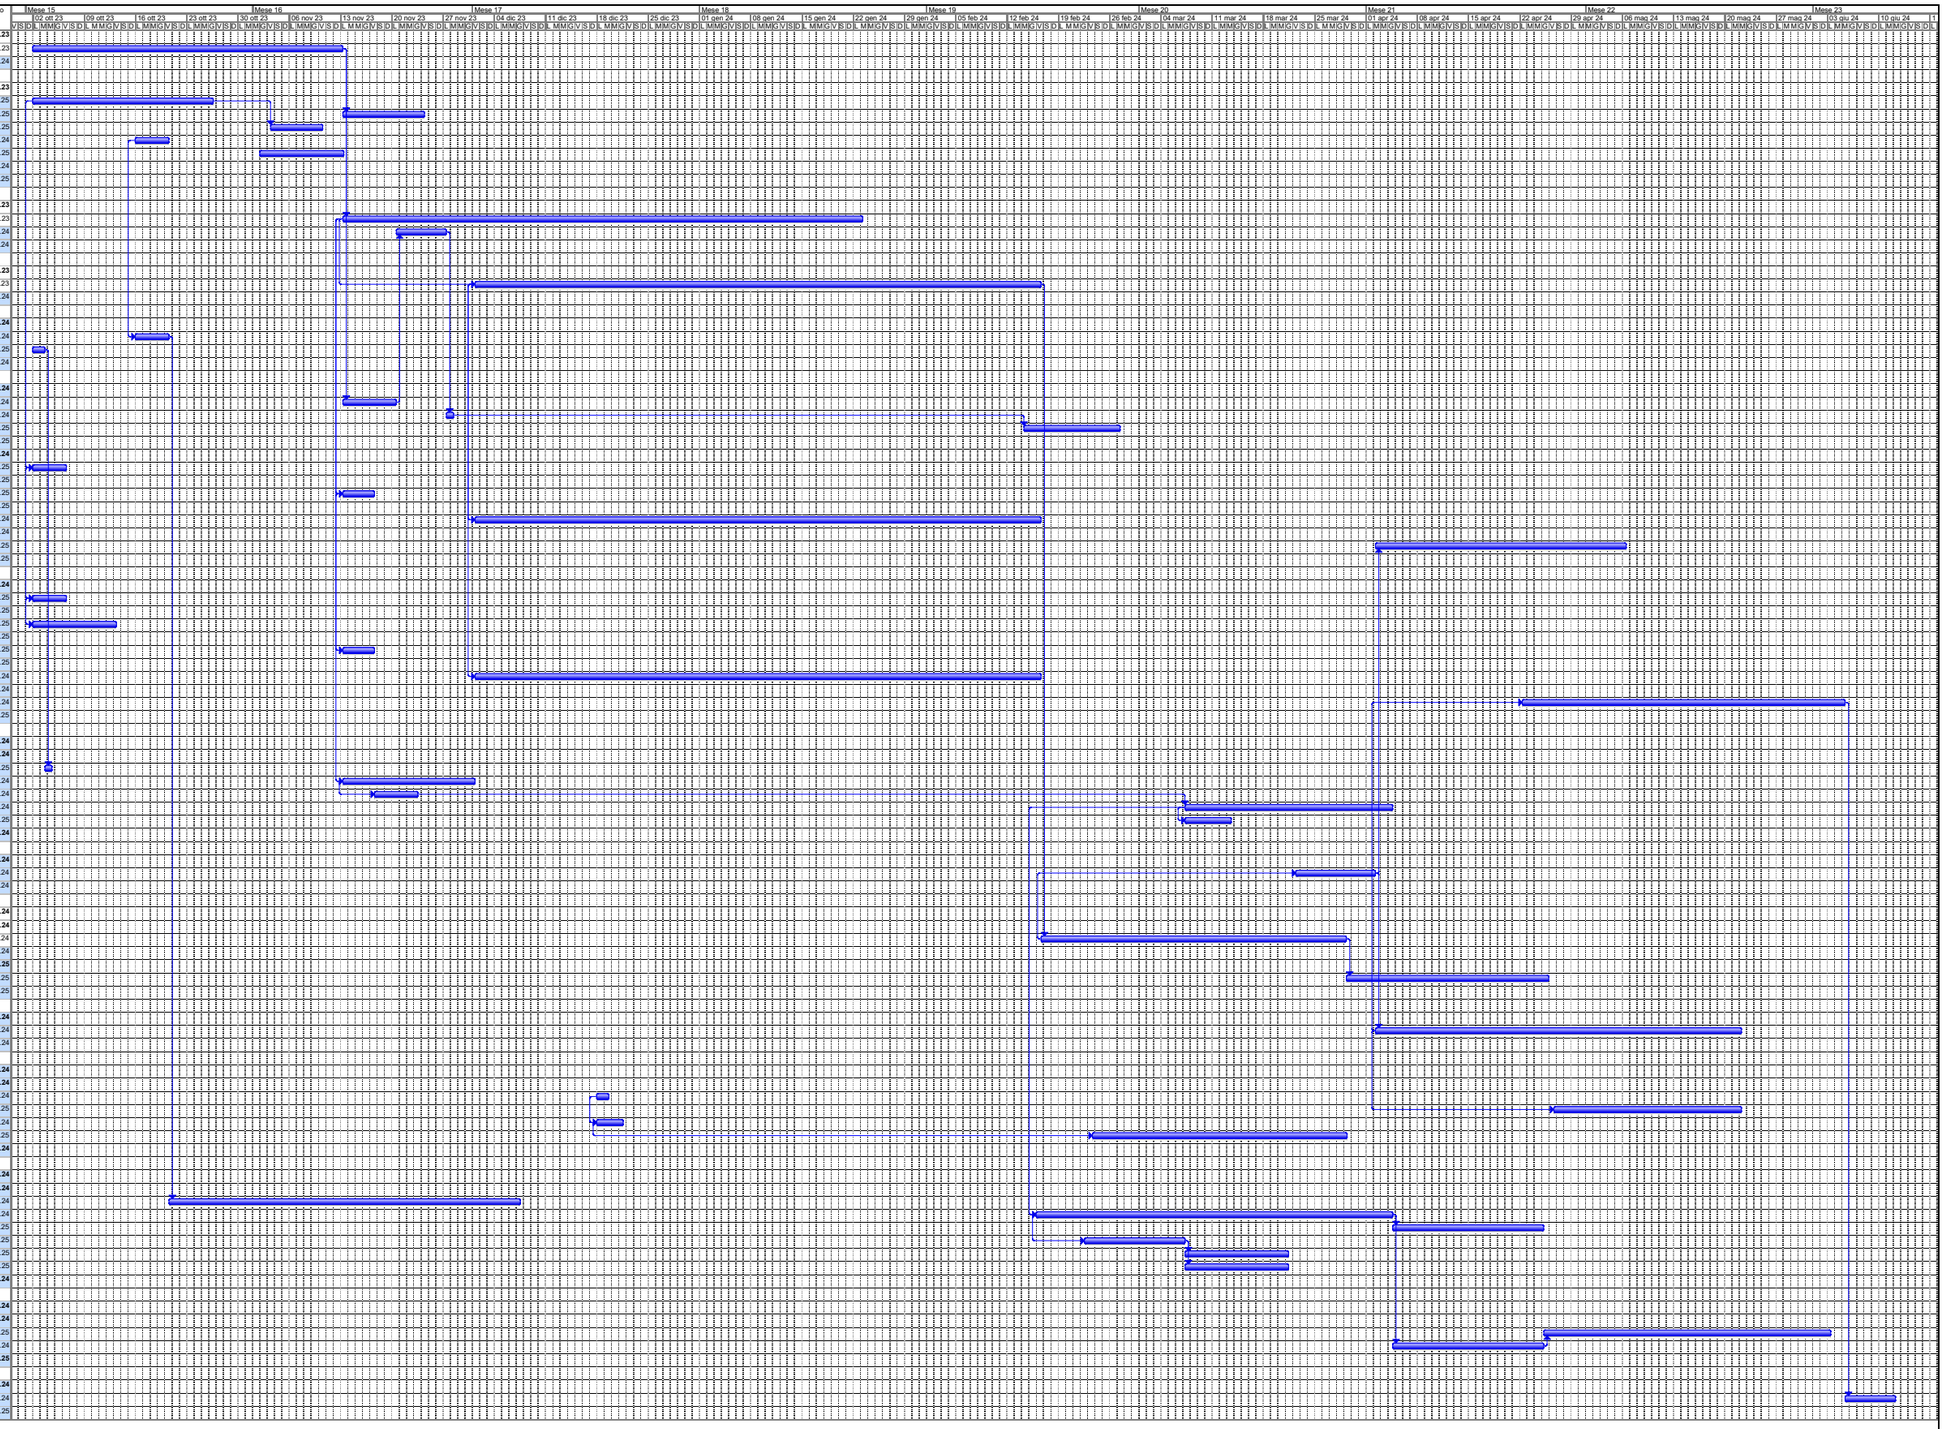

ALLEGATO 2

E1085- RISTRUTTURAZIONE VILLA ORTENSIA MENDRISIO

AOA - Ferrari, Castel San Pietro
Data: mer 19.10.22

Attività

Divisione
