LICEO MENDRISIO
PROGRAMMA LAVORI GENERALE

DIREZIONE LAVORI SA
mar 18.11.25
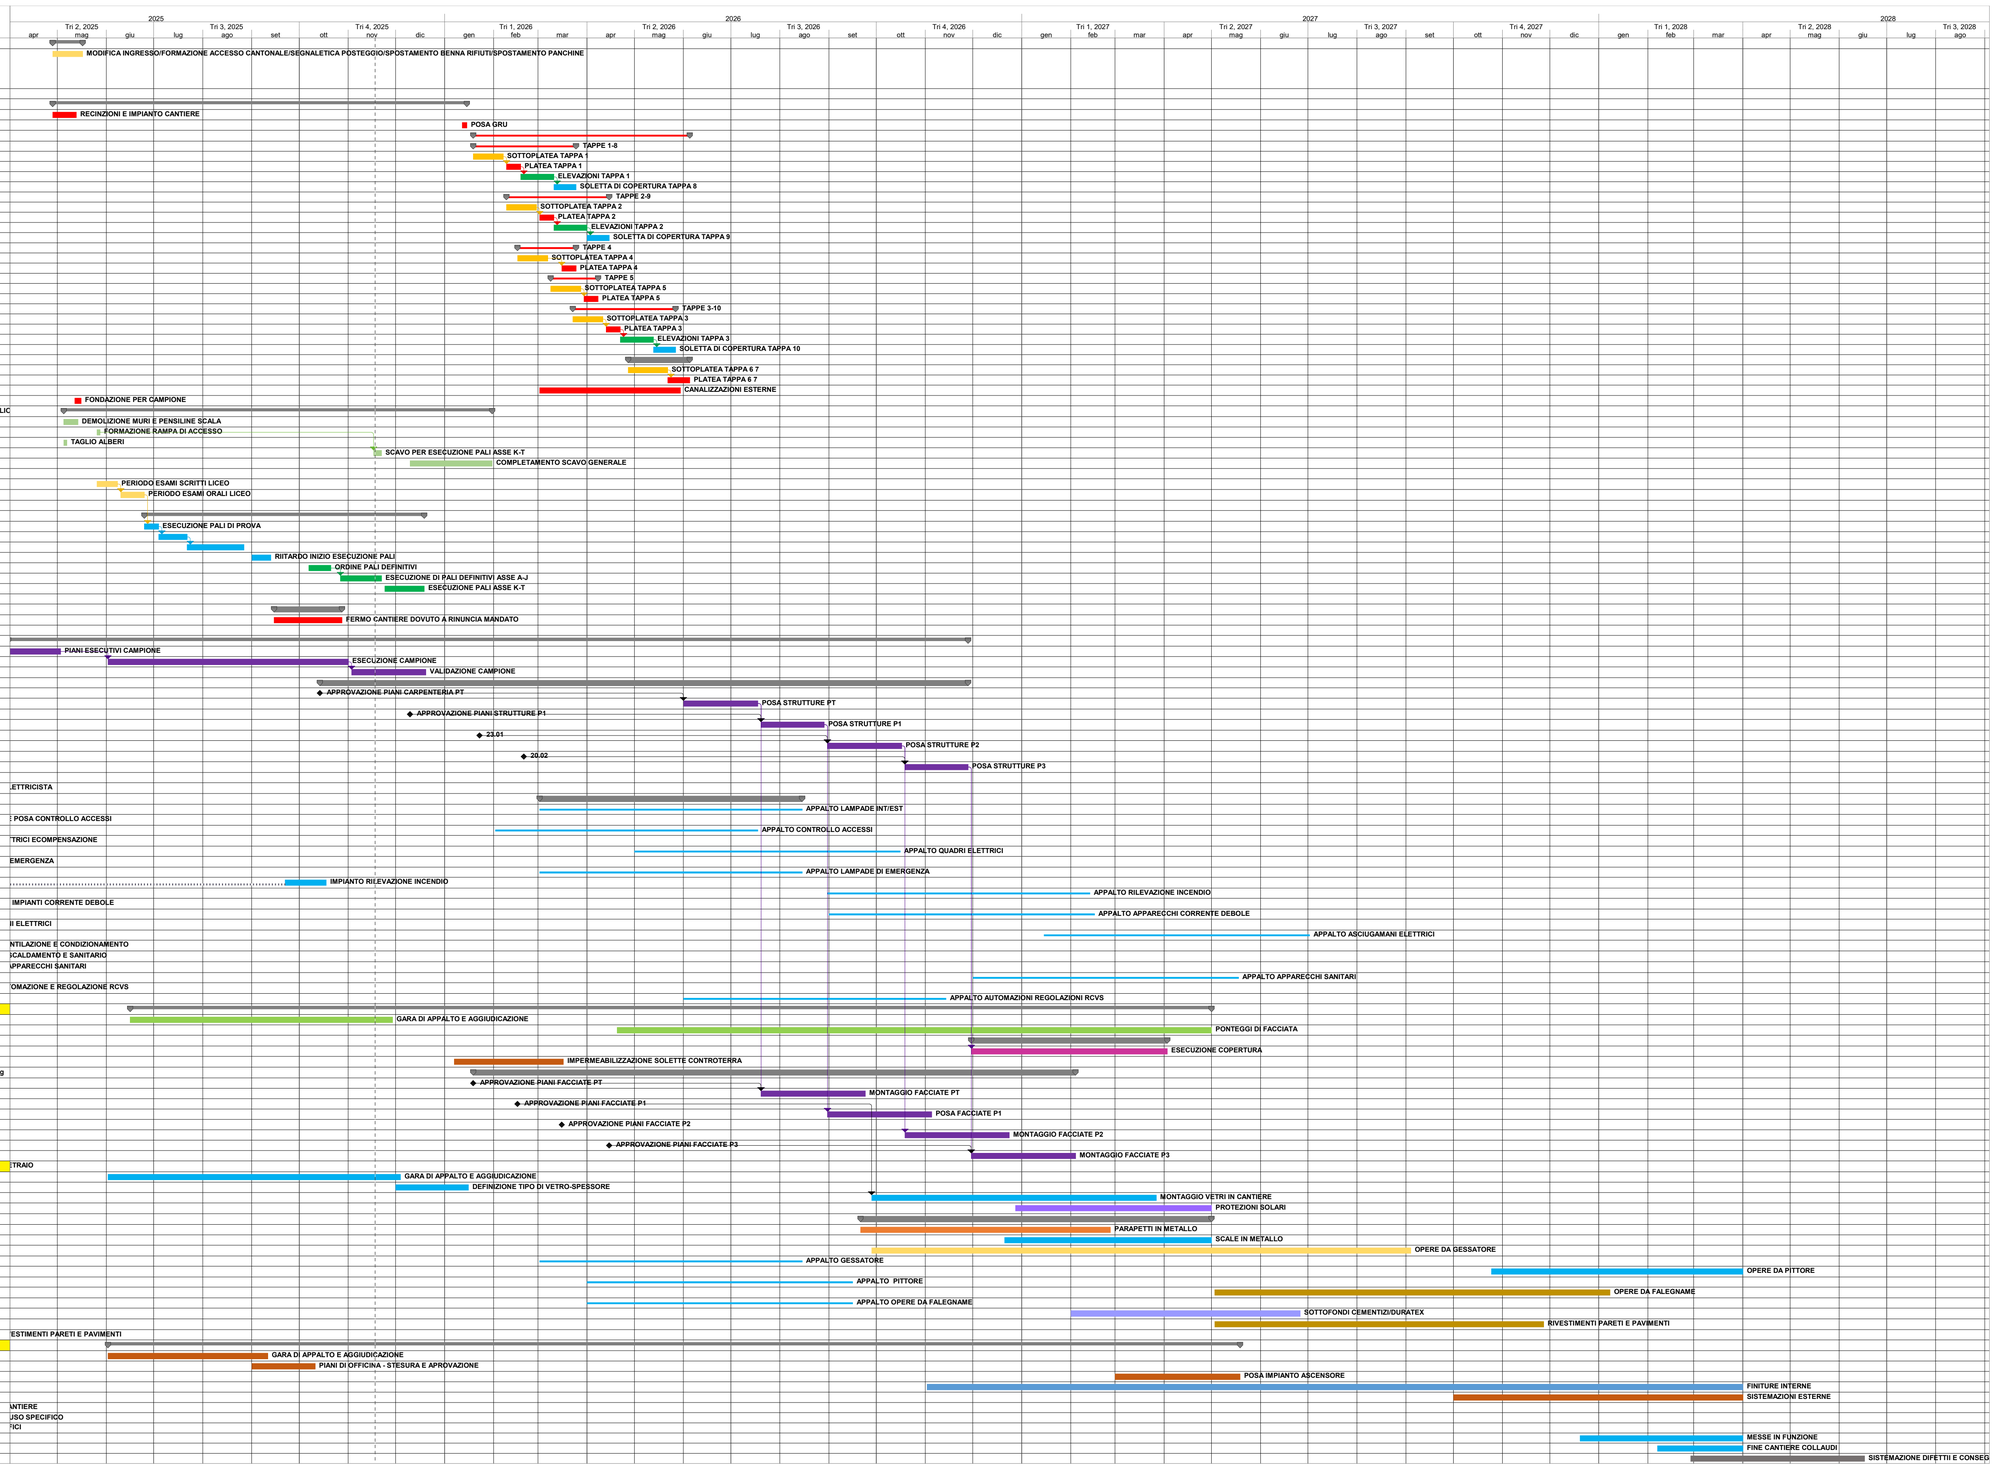
ID	CCC	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Ditta
1		**PREPARAZIONI PRELIMINARI**	**14 g?**	**lun 28.04.25**	**ven 16.05.25**	
2		MODIFICA INGRESSO/FORMAZIONE ACCESSO CANTONALE/SEGNALETICA POSTEGGIO/SPOSTAMENTO BENNA RIFIUTI/SPOSTAMENTO PANCHINE	14 g?	lun 28.04.25	ven 16.05.25	
3						
4	B	**OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE (gg75)**	**162 g**	**lun 28.04.25**	**mer 14.01.26**	BARELLA
5		RECINZIONI E IMPIANTO CANTIERE	10 g	lun 28.04.25	lun 12.05.25	
6		POSA GRU	3 g	lun 12.01.26	mer 14.01.26	
7		**OPERA GREZZA**	**99 g**	**lun 19.01.26**	**gio 04.06.26**	
8		**TAPPE 1-8**	**47 g**	**lun 19.01.26**	**mar 24.03.26**	
9		SOTTOPLATEA TAPPA 1	15 g	lun 19.01.26	ven 06.02.26	
10		PLATEA TAPPA 1	7 g	lun 09.02.26	mar 17.02.26	
11		ELEVAZIONI TAPPA 1	15 g	mer 18.02.26	mar 10.03.26	
12		SOLETTA DI COPERTURA TAPPA 8	10 g	mer 11.03.26	mar 24.03.26	
13		**TAPPE 2-9**	**47 g**	**lun 09.02.26**	**mar 14.04.26**	
14		SOTTOPLATEA TAPPA 2	15 g	lun 09.02.26	ven 27.02.26	
15		PLATEA TAPPA 2	7 g	lun 02.03.26	mar 10.03.26	
16		ELEVAZIONI TAPPA 2	15 g	mer 11.03.26	mar 31.03.26	
17		SOLETTA DI COPERTURA TAPPA 9	10 g	mer 01.04.26	mar 14.04.26	
18		**TAPPE 4**	**27 g**	**lun 16.02.26**	**mar 24.03.26**	
19		SOTTOPLATEA TAPPA 4	15 g	lun 16.02.26	ven 06.03.26	
20		PLATEA TAPPA 4	7 g	lun 16.03.26	mar 24.03.26	
21		**TAPPE 5**	**22 g**	**lun 09.03.26**	**mar 07.04.26**	
22		SOTTOPLATEA TAPPA 5	15 g	lun 09.03.26	ven 27.03.26	
23		PLATEA TAPPA 5	7 g	lun 30.03.26	mar 07.04.26	
24		**TAPPE 3-10**	**47 g**	**lun 23.03.26**	**mar 26.05.26**	
25		SOTTOPLATEA TAPPA 3	15 g	lun 23.03.26	ven 10.04.26	
26		PLATEA TAPPA 3	7 g	lun 13.04.26	mar 21.04.26	
27		ELEVAZIONI TAPPA 3	15 g	mer 22.04.26	mar 12.05.26	
28		SOLETTA DI COPERTURA TAPPA 10	10 g	mer 13.05.26	mar 26.05.26	
29		**TAPPA 6-7**	**29 g**	**lun 27.04.26**	**gio 04.06.26**	
30		SOTTOPLATEA TAPPA 6 7	19 g	lun 27.04.26	gio 21.05.26	
31		PLATEA TAPPA 6 7	10 g	ven 22.05.26	gio 04.06.26	
32		CANALIZZAZIONI ESTERNE	65 g?	lun 02.03.26	ven 29.05.26	
33		FONDAZIONE PER CAMPIONE	4 g?	lun 12.05.25	gio 15.05.25	
34	B	**SCAVI E DEMOLIZIONI (34 gg)**	**170 g?**	**lun 05.05.25**	**ven 30.01.26**	CONTRABI GABAGLIO
35		DEMOLIZIONE MURI E PENSILINE SCALA	7 g	lun 05.05.25	mar 13.05.25	
36		FORMAZIONE RAMPA DI ACCESSO	2 g	lun 26.05.25	mar 27.05.25	
37		TAGLIO ALBERI	2 g	lun 05.05.25	mar 06.05.25	
38		SCAVO PER ESECUZIONE PALI ASSE K-T	5 g	lun 17.11.25	ven 21.11.25	
39		COMPLETAMENTO SCAVO GENERALE	28 g	mer 10.12.25	ven 30.01.26	
40						
41		**PERIODO ESAMI SCRITTI LICEO**	9 g?	lun 26.05.25	sab 07.06.25	
42		**PERIODO ESAMI ORALI LICEO**	10 g?	mar 10.06.25	mar 24.06.25	
43						
44	B	**PALI (15gg)**	**115 g?**	**mer 25.06.25**	**gio 18.12.25**	
45		ESECUZIONE PALI DI PROVA	7 g?	mer 25.06.25	gio 03.07.25	MUTTONI
46		MATURAZIONI E PROVE	12 g	ven 04.07.25	lun 21.07.25	MUTTONI
47		ANALISI PROVE E OTTIMIZZAZIONI	15 g	mar 22.07.25	mar 26.08.25	MUTTONI
48		RIITARDO INIZIO ESECUZIONE PALI	10 g?	lun 01.09.25	ven 12.09.25	MUTTONI
49		ORDINE PALI DEFINITIVI	10 g	mar 07.10.25	lun 20.10.25	GEOEDIL
50		ESECUZIONE DI PALI DEFINITIVI ASSE A-J	20 g	lun 27.10.25	ven 21.11.25	GEOEDIL
51		ESECUZIONE PALI ASSE K-T	18 g?	lun 24.11.25	gio 18.12.25	
52						
53		**FERMO CANTIERE**	**31 g?**	**lun 15.09.25**	**lun 27.10.25**	
54		FERMO CANTIERE DOVUTO A RINUNCIA MANDATO	31 g?	lun 15.09.25	lun 27.10.25	
55						
56	B/C	**LEGNO STRUTTURALE**	**408 g?**	**lun 31.03.25**	**ven 27.11.26**	VERAGOUTH
57		PIANI ESECUTIVI CAMPIONE	23 g?	lun 31.03.25	ven 02.05.25	
58		ESECUZIONE CAMPIONE	97 g	lun 02.06.25	ven 31.10.25	
59		**VALIDAZIONE CAMPIONE**	**34 g?**	**lun 03.11.25**	**ven 19.12.25**	
60		**Conteggio giorni lavorativi**	**253 g**	**mar 14.10.25**	**ven 27.11.26**	**240 gg**
61		APPROVAZIONE PIANI CARPENTERIA PT	0 g	mar 14.10.25	mar 14.10.25	
62		**POSA STRUTTURE PT**	35 g	lun 01.06.26	ven 17.07.26	
63		APPROVAZIONE PIANI STRUTTURE P1	0 g	mer 10.12.25	mer 10.12.25	
64		**POSA STRUTTURE P1**	30 g	lun 20.07.26	ven 28.08.26	
65		APPROVAZIONE PIANI STRUTTURE P2	0 g	ven 23.01.26	ven 23.01.26	
66		**POSA STRUTTURE P2**	35 g	lun 31.08.26	ven 16.10.26	
67		APPROVAZIONE PIANI STRUTTURE P3	0 g	ven 20.02.26	ven 20.02.26	
68		**POSA STRUTTURE P3**	30 g	lun 19.10.26	ven 27.11.26	
69						
70	D/F/I	**OPERE DA ELETTRICISTA**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	ETAVIS
71	D/I	**LAMPADE ORDINARIE INTERNO/ESTERNO**	**120 g**	**lun 02.03.26**	**ven 14.08.26**	DA APPALTARE
72		APPALTO LAMPADE INT/EST	120 g	lun 02.03.26	ven 14.08.26	
73	D	**FORNITURA E POSA CONTROLLO ACCESSI**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	DA APPALTARE
74		APPALTO CONTROLLO ACCESSI	120 g	lun 02.02.26	ven 17.07.26	
75	D	**QUADRI ELETTRICI ECOMPENSAZIONE**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	DA APPALTARE
76		APPALTO QUADRI ELETTRICI	120 g	ven 01.05.26	gio 15.10.26	
77	D	**LAMPADE DI EMERGENZA**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	DA APPALTARE
78		APPALTO LAMPADE DI EMERGENZA	120 g	lun 02.03.26	ven 14.08.26	
79	D	**IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO**	21 g?	ven 28.02.25	ven 17.10.25	DA APPALTARE
80		APPALTO RILEVAZIONE INCENDIO	120 g	lun 31.08.26	ven 12.02.27	
81	D	**APPARECCHI IMPIANTI CORRENTE DEBOLE**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	DA APPALTARE
82		APPALTO APPARECCHI CORRENTE DEBOLE	120 g	mar 01.09.26	lun 15.02.27	
83	D	**ASCIUGAMANI ELETTRICI**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	DA APPALTARE
84		APPALTO ASCIUGAMANI ELETTRICI	120 g	ven 15.01.27	gio 01.07.27	
85	D26	**IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	AIRCOND
86	D58	**IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	CONCONI
87	D58	**FORNITURA APPARECCHI SANITARI**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	
88		APPALTO APPARECCHI SANITARI	120 g	mar 01.12.26	lun 17.05.27	
89	D58	**IMPIANTI AUTOMAZIONE E REGOLAZIONE RCVS**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	
90		APPALTO AUTOMAZIONI REGOLAZIONI RCVS	120 g	lun 01.06.26	ven 13.11.26	
91	B	**PONTEGGI**	**467 g**	**lun 16.06.25**	**ven 30.04.27**	LCPUBB
92		GARA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE	108 g	lun 16.06.25	ven 28.11.25	
93		PONTEGGI DI FACCIATA	270 g	lun 20.04.26	ven 30.04.27	
94	E/F	**ISOLAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI**	**90 g**	**lun 30.11.26**	**ven 02.04.27**	CORTI
95		ESECUZIONE COPERTURA	90 g	lun 30.11.26	ven 02.04.27	
96	E/F	**IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTE CONTROTERRA**	49 g?	mer 07.01.26	lun 16.03.26	DIRETTO
97	E	**OPERE DA FALEGNAME - FACCIATE ESTERNE**	**273 g**	**lun 19.01.26**	**mer 03.02.27**	VERAGOUTH 194 gg
98		APPROVAZIONE PIANI FACCIATE PT	0 g	lun 19.01.26	lun 19.01.26	
99		MONTAGGIO FACCIATE PT	48 g	lun 20.07.26	mer 23.09.26	
100		APPROVAZIONE PIANI FACCIATE P1	0 g	lun 16.02.26	lun 16.02.26	
101		POSA FACCIATE P1	48 g	lun 31.08.26	mer 04.11.26	
102		APPROVAZIONE PIANI FACCIATE P2	0 g	lun 16.03.26	lun 16.03.26	
103		MONTAGGIO FACCIATE P2	48 g	lun 19.10.26	mer 23.12.26	
104		APPROVAZIONE PIANI FACCIATE P3	0 g	mer 15.04.26	mer 15.04.26	
105		MONTAGGIO FACCIATE P3	48 g	lun 30.11.26	mer 03.02.27	
106	E	**OPERE DA VETRAIO**	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	CIAP
107		GARA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE	120 g	lun 02.06.25	mer 03.12.25	
108		DEFINIZIONE TIPO DI VETRO-SPESSORE	23 g?	lun 01.12.25	gio 15.01.26	
109		MONTAGGIO VETRI IN CANTIERE	130 g	lun 28.09.26	ven 26.03.27	
110	E	**PROTEZIONI SOLARI**	90 g	lun 28.12.26	ven 30.04.27	SHENKER
111	C/E/G/I	**COSTRUZIONI METALLICHE**	**160 g**	**lun 21.09.26**	**ven 30.04.27**	
112		PARAPETTI IN METALLO	114 g	lun 21.09.26	gio 25.02.27	
113		SCALE IN METALLO	95 g	lun 21.12.26	ven 30.04.27	
114	G	**OPERE DA GESSATORE**	245 g	lun 28.09.26	ven 03.09.27	
115		APPALTO GESSATORE	120 g	lun 02.03.26	ven 14.08.26	
116		**OPERE DA PITTORE**	115 g?	lun 25.10.27	ven 31.03.28	
117		APPALTO PITTORE	120 g	mer 01.04.26	mar 15.09.26	
118	G/E	**OPERE DA FALEGNAME**	180 g?	lun 03.05.27	ven 07.01.28	
119		APPALTO OPERE DA FALEGNAME	120 g	mer 01.04.26	mar 15.09.26	
120	G	**SOTTOFONDI CEMENTIZI/DURATEX**	105 g	lun 01.02.27	ven 25.06.27	PAVIMAN
121	G	**RIVESTIMENTI PARETI E PAVIMENTI**	150 g?	lun 03.05.27	ven 26.11.27	
122		APPALTO RIVESTIMENTI PARETI E PAVIMENTI	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	ESTIMENTI PARETI E PAVIMENTI
123	D	**ASCENSORI**	**488 g**	**lun 02.06.25**	**mar 18.05.27**	INVITO/DIRETTO
124		GARA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE	60 g	lun 02.06.25	mer 10.09.25	
125		PIANI DI OFFICINA - STESURA E APROVAZIONE	30 g	lun 01.09.25	ven 10.10.25	
126		POSA IMPIANTO ASCENSORE	57 g	lun 01.03.27	mar 18.05.27	
127		FINITURE INTERNE	370 g?	lun 02.11.26	ven 31.03.28	
128	E	SISTEMAZIONI ESTERNE	131 g	ven 01.10.27	ven 31.03.28	
129	G	PULIZIE DI CANTIERE	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	ANTIERE
130		IMPIANTI AD USO SPECIFICO	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	USO SPECIFICO
131		ARREDO EDIFICI	1 g?	ven 28.02.25	ven 28.02.25	FICI
132		MESSE IN FUNZIONE	75 g	lun 20.12.27	ven 31.03.28	
133		FINE CANTIERE COLLAUDI	40 g	lun 07.02.28	ven 31.03.28	
134		SISTEMAZIONE DIFETTII E CONSEGNA DELL'OPERA	80 g	lun 28.02.28	ven 16.06.28
