RISTRUTTURAZIONE INFOCENTRO POLLEGIO
ESTRATTO PROGRAMMA LAVORI
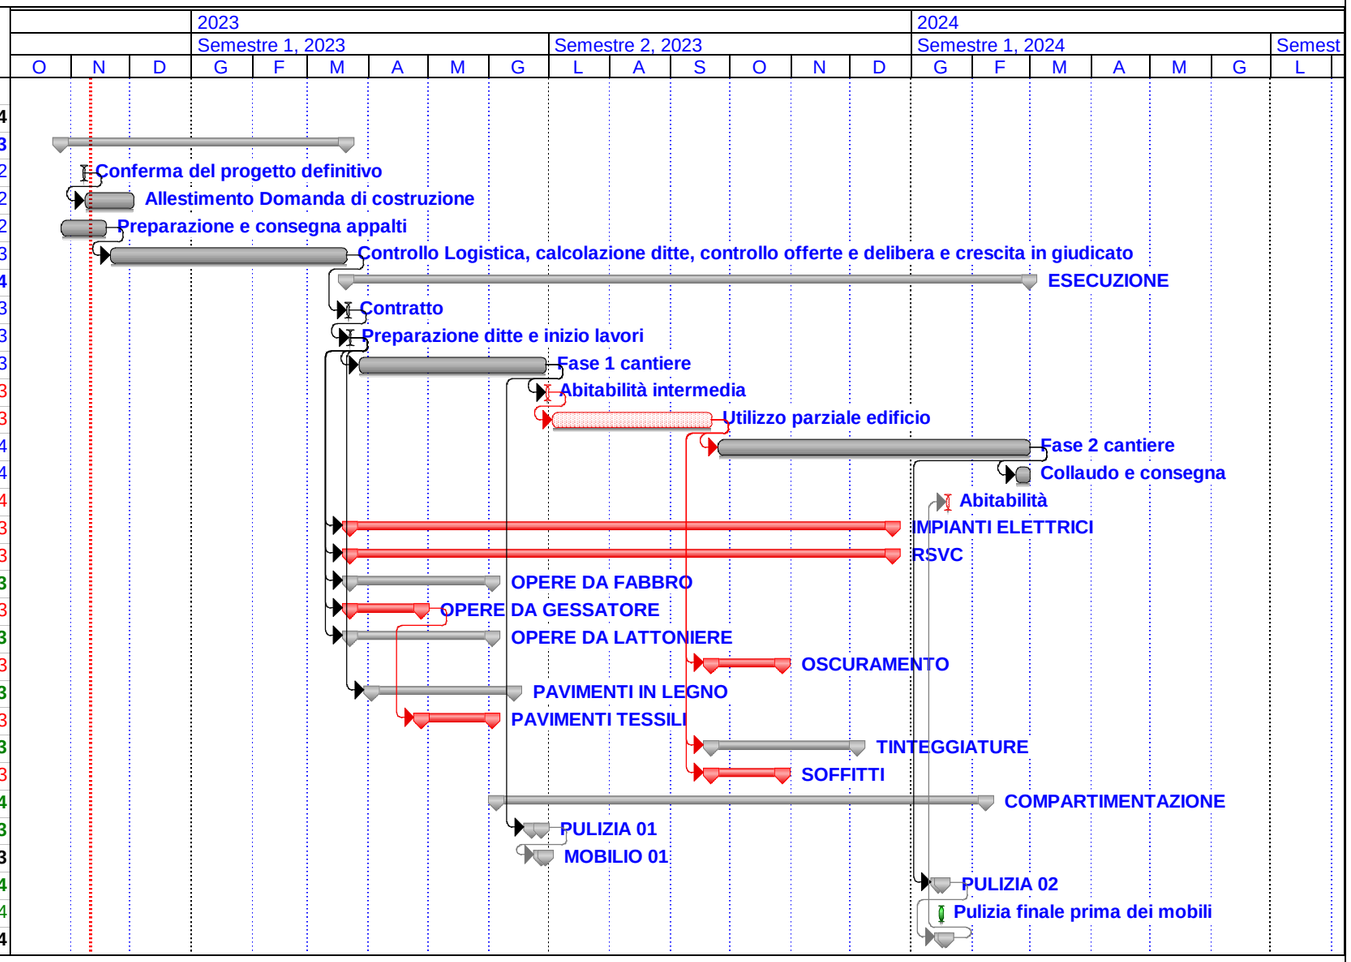
ID	Testo1	Testo2	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1						
2			**PROGRAMMA GENERALE**	**36 g**	**gio 13.11.03**	**gio 01.01.04**
3			**PROGETTAZIONE**	**103 g**	**gio 27.10.22**	**lun 20.03.23**
4		SL	Conferma del progetto definitivo	1 g	lun 07.11.22	lun 07.11.22
5		Progettisti	Allestimento Domanda di costruzione	19 g	mar 08.11.22	ven 02.12.22
6		Progettisti	Preparazione e consegna appalti	17 g	gio 27.10.22	ven 18.11.22
7		SL	Controllo Logistica, calcolazione ditte, controllo offerte e de	86 g	lun 21.11.22	lun 20.03.23
8			**ESECUZIONE**	**217 g**	**mar 21.03.23**	**gio 29.02.24**
9		SL	Contratto	1 g	mar 21.03.23	mar 21.03.23
10		Ditte	Preparazione ditte e inizio lavori	1 g	mer 22.03.23	mer 22.03.23
11		Ditte	Fase 1 cantiere	69 g	lun 27.03.23	gio 29.06.23
12		DIV	Abitabilità intermedia	1 g	ven 30.06.23	ven 30.06.23
13		Comm	Utilizzo parziale edificio	43 g	lun 03.07.23	gio 21.09.23
14		Ditte	Fase 2 cantiere	99 g	lun 25.09.23	gio 29.02.24
15		Ditte	Collaudo e consegna	5 g	ven 23.02.24	gio 29.02.24
16		DIV	Abitabilità	1 g	ven 19.01.24	ven 19.01.24
17			**IMPIANTI ELETTRICI**	181 g	gio 23.03.23	ven 22.12.23
27			**RSVC**	181 g	gio 23.03.23	ven 22.12.23
37			**OPERE DA FABBRO**	**52 g**	**gio 23.03.23**	**ven 02.06.23**
44			**OPERE DA GESSATORE**	26 g	gio 23.03.23	gio 27.04.23
50			**OPERE DA LATTONIERE**	**52 g**	**gio 23.03.23**	**ven 02.06.23**
57			**OSCURAMENTO**	26 g	ven 22.09.23	ven 27.10.23
63			**PAVIMENTI IN LEGNO**	**52 g**	**lun 03.04.23**	**mar 13.06.23**
70			**PAVIMENTI TESSILI**	26 g	ven 28.04.23	ven 02.06.23
76			**TINTEGGIATURE**	**52 g**	**ven 22.09.23**	**lun 04.12.23**
83			**SOFFITTI**	26 g	ven 22.09.23	ven 27.10.23
89			**COMPARTIMENTAZIONE**	**147 g**	**lun 05.06.23**	**mer 07.02.24**
93			**PULIZIA 01**	**3 g**	**ven 23.06.23**	**mar 27.06.23**
95			**MOBILIO 01**	**2 g**	**mer 28.06.23**	**gio 29.06.23**
97			**PULIZIA 02**	**2 g**	**lun 15.01.24**	**mar 16.01.24**
98		Da definire	Pulizia finale prima dei mobili	2 g	lun 15.01.24	mar 16.01.24
99			**MOBILIO 02**	**2 g**	**mer 17.01.24**	**gio 18.01.24**
