CRONOPROGRAMMA INDICATIVO
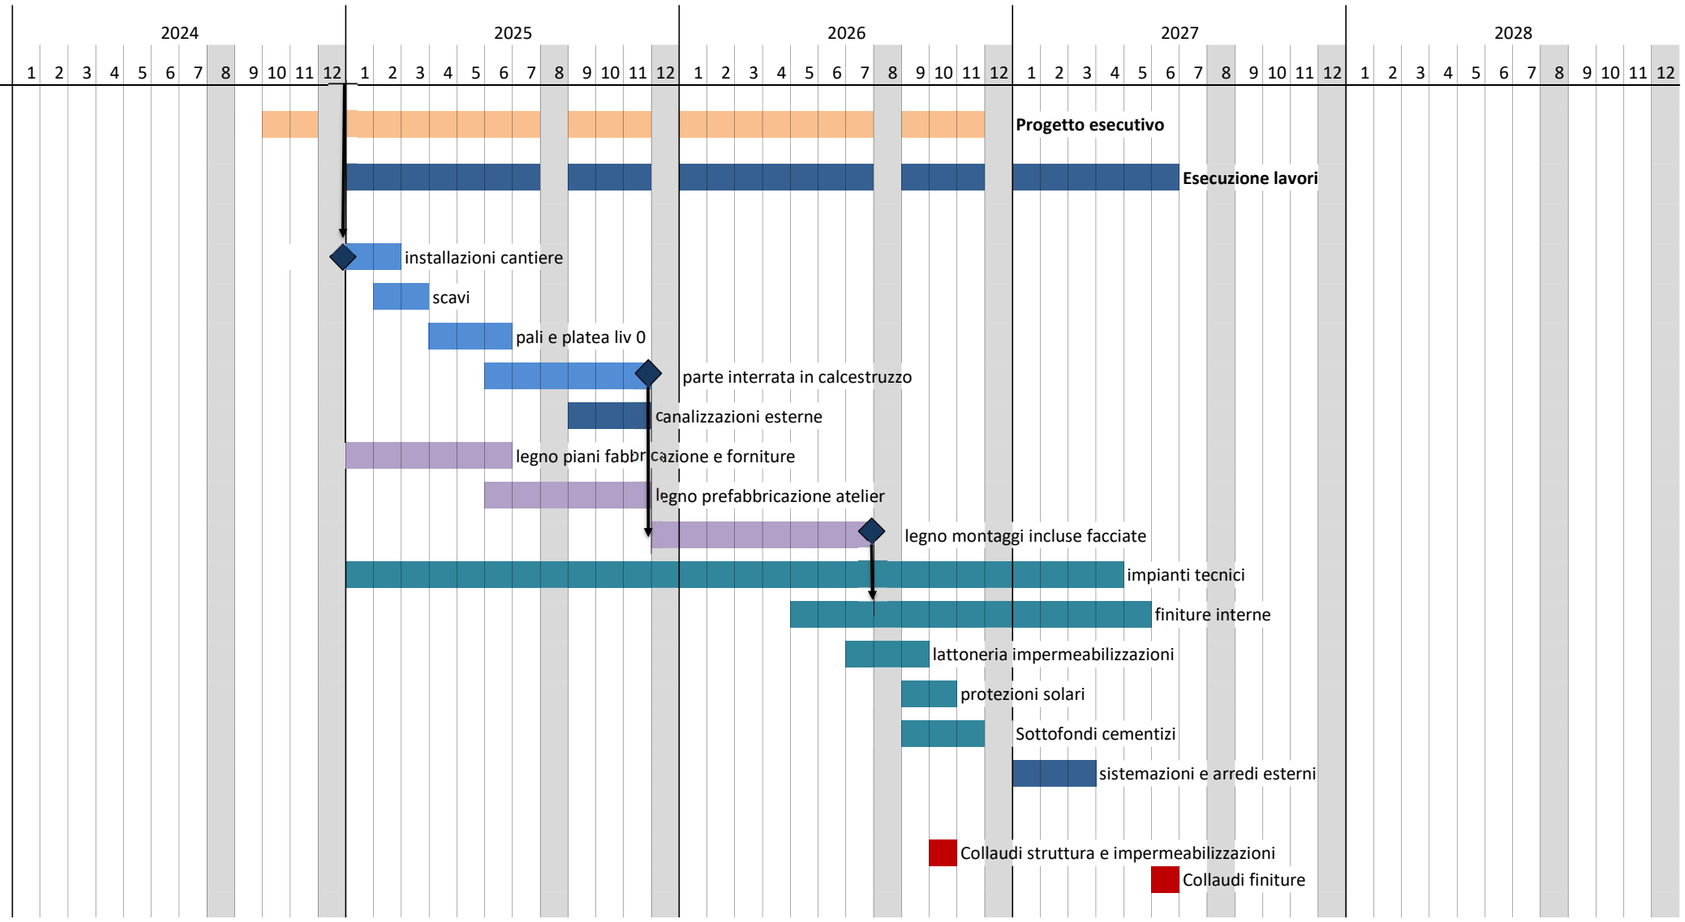
fase SIA	Descrizione	durata	responsabile
51	**Progetto esecutivo**	22 mesi	team
52	**Esecuzione lavori**	28 mesi	
	sondaggi geognostici prove infiltrazione	3 mesi	ing. Civile
	installazioni cantiere	2 mesi	capomastro
	scavi	2 mesi	impresa
	pali e platea liv 0	3 mesi	capomastro
	parte interrata in calcestruzzo	6 mesi	capomastro
	canalizzazioni esterne	3 mesi	capomastro
	legno piani fabbricazione e forniture	6 mesi	carpentiere
	legno prefabbricazione atelier	6 mesi	carpentiere
	legno montaggi incluse facciate	8 mesi	carpentiere
	impianti tecnici	28 mesi	artigiani
	finiture interne	13 mesi	artigiani
	lattoneria impermeabilizzazioni	3 mesi	artigiani
	protezioni solari	2 mesi	artigiani
	Sottofondi cementizi	3 mesi	artigiani
	sistemazioni e arredi esterni	3 mesi	artigiani
53	**Messa in esercizio**		
	Collaudi struttura e impermeabilizzazioni	1 mese	tutti
	Collaudi finiture	2 mesi	tutti
