Consorzio META

E5051 - COMPARTO SCUOLE MEDIE LODRINO

Lugano, 11.02.2025

41 Fase appalti

CRONOPROGRAMMA
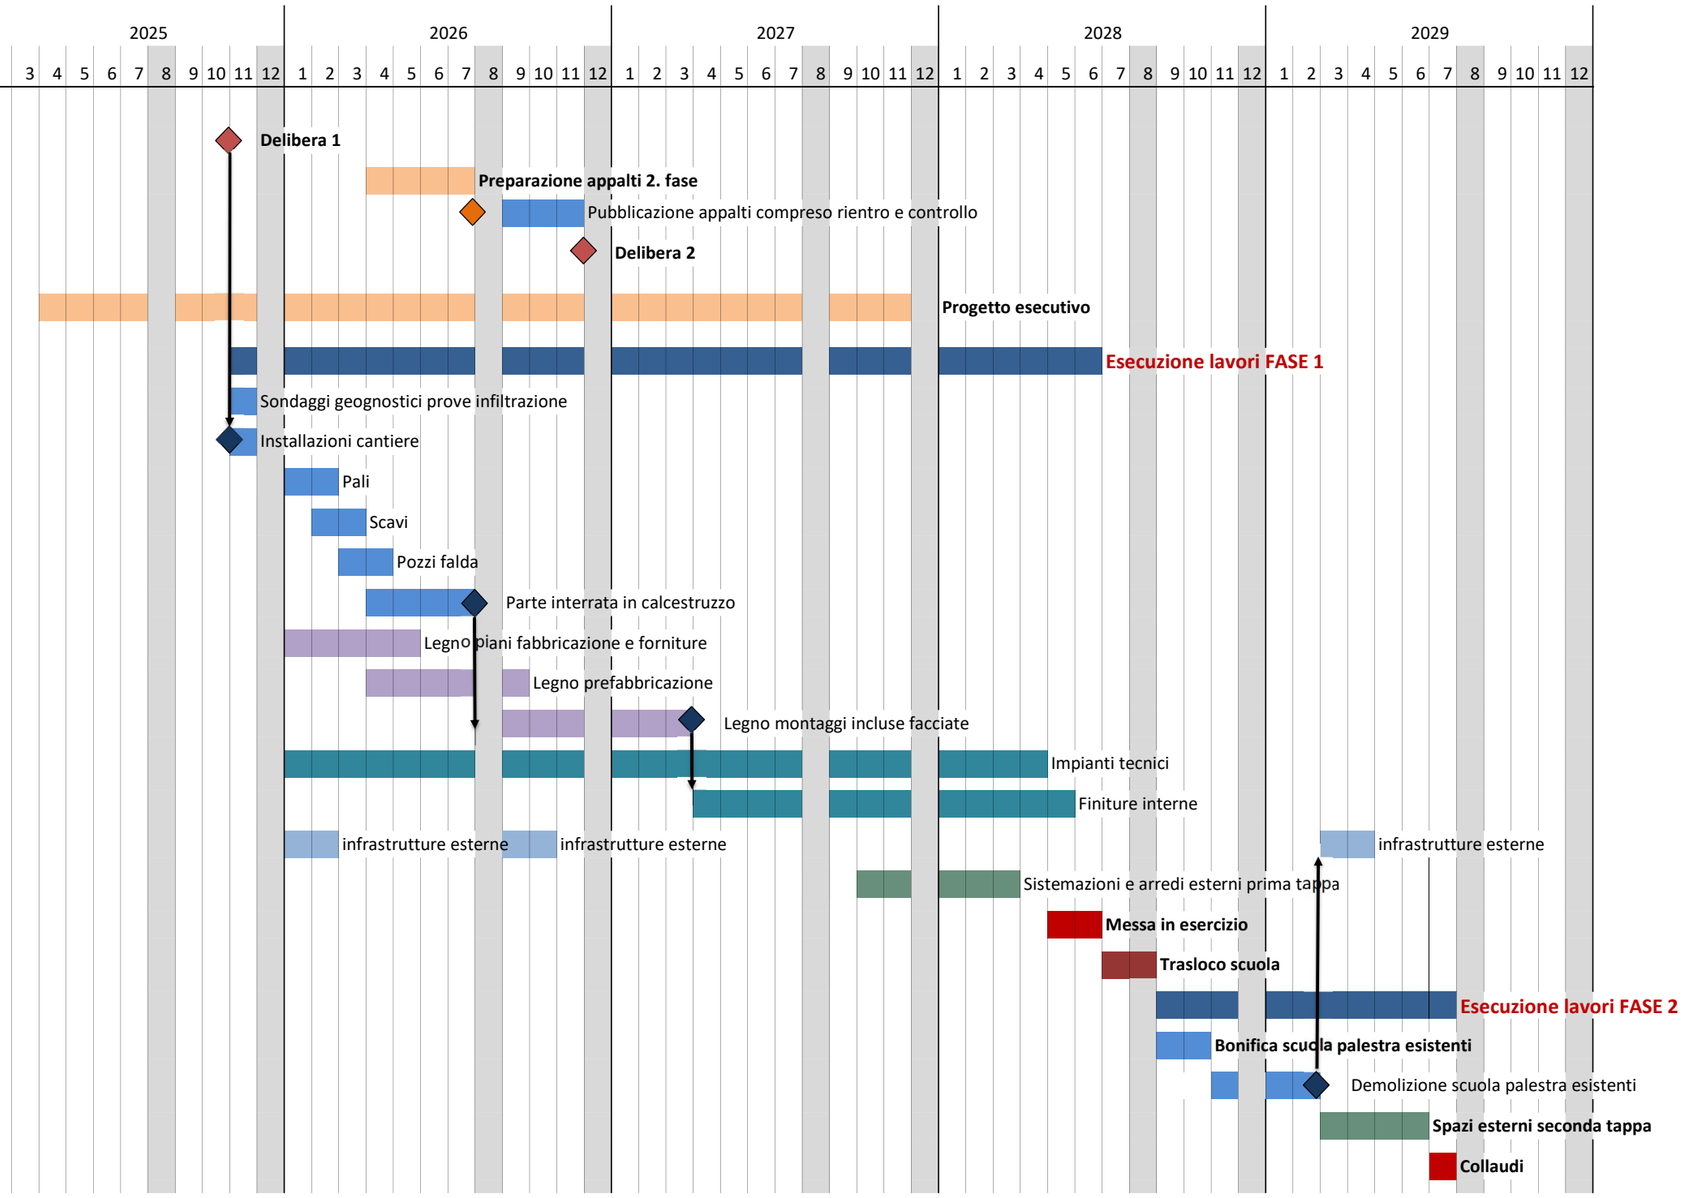
fase SIA	Descrizione	durata	responsabile
	Delibera 1	2 mesi	logistica
41	**Preparazione appalti 2. fase**	4 mesi	team
	Pubblicazione appalti compreso rientro e controllo	3 mesi	procedura
	Delibera 2	1 mese	logistica
51	**Progetto esecutivo**	32 mesi	team
52	**Esecuzione lavori FASE 1**	32 mesi	tutti
	Sondaggi geognostici prove infiltrazione	2 mesi	imprenditore
	Installazioni cantiere	1 mesi	capomastro
	Pali	1.5 mesi	imprenditore
	Scavi	2.5 mesi	imprenditore
	Pozzi falda	1.5 mesi	imprenditore
	Parte interrata in calcestruzzo	4 mesi	capomastro
	Legno piani fabbricazione e forniture	5 mesi	carpentiere
	Legno prefabbricazione	5 mesi	carpentiere
	Legno montaggi incluse facciate	6 mesi	carpentiere
	Impianti tecnici	24 mesi	imprenditore
	Finiture interne	12 mesi	imprenditore
	infrastrutture esterne	7 mesi	capomastro
	Sistemazioni e arredi esterni prima tappa	5 mesi	imprenditore
53	**Messa in esercizio**	2 mesi	tutti
	Trasloco scuola	2 mesi	logistica
52	**Esecuzione lavori FASE 2**	11 mesi	tutti
	Bonifica scuola palestra esistenti	2 mesi	imprenditore
	Demolizione scuola palestra esistenti	3 mesi	imprenditore
	Spazi esterni seconda tappa	4 mesi	imprenditore
53	**Collaudi**	1 mese	tutti
