ID	Modalità attività	Nome attività	Durata
1		**Fase 1: Lavorazioni preliminari**	**5 g**
2		Implementazione strada provvisoria	5 g
3		Installazioni di cantiere	5 g
4		**Fase 2: Ampliamento prima tratta di strada**	**55 g**
5		Realizzazione parcheggi provvisori	5 g
6		Rimozione neofite invasive	5 g
7		Esbosco in prossimità della strada	5 g
8		Movimentazioni di materiale	30 g
9		Realizzazione infrastrutture	35 g
10		Realizzazione strada	30 g
11		Posa elementi in metallici	5 g
12		**Fase 3: Ampliamento seconda tratta di strada**	**60 g**
13		Esbosco in prossimità della strada	5 g
14		Movimentazioni di materiale	30 g
15		Realizzazione infrastrutture	30 g
16		Realizzazione strada	40 g
17		Posa elementi in metallici	5 g
18		**Lavorazioni parallele**	**60 g**
19		Demolizione edifici	60 g
20		Esbosco presso le linee di tiro	60 g
21		Realizzazione infrastrutture	60 g
22		Inizio lavori scavo fossa e galleria (lavorazioni non di questo appalto)	0 g

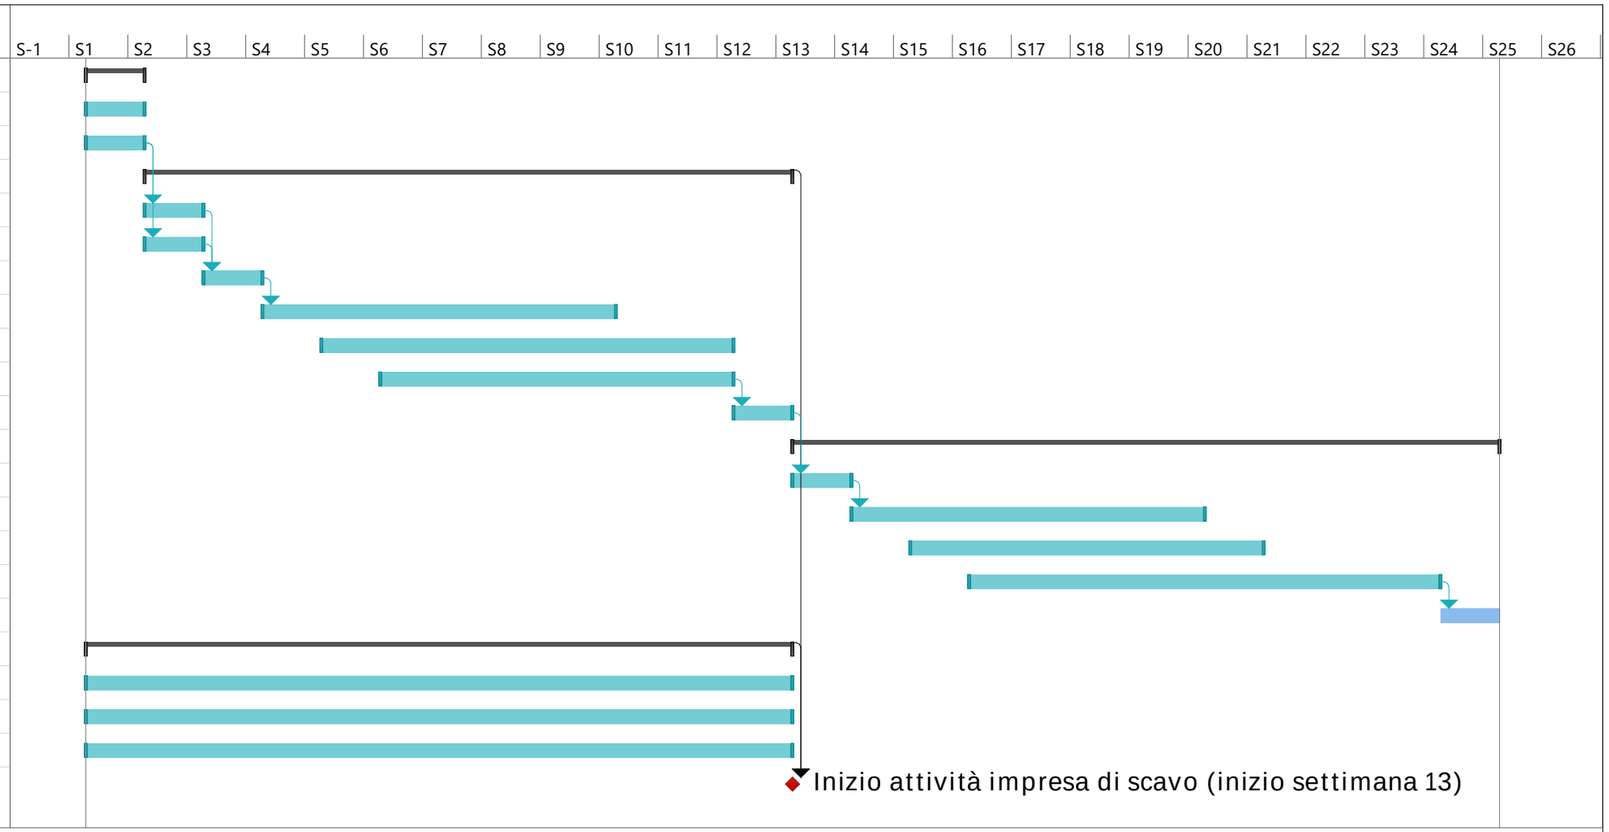

Progetto: Programma lavori
Data: gio 02.07.26

Attività	Riepilogo progetto	Attività manuale	Solo inizio	Scadenza
Divisione	Attività inattiva	Solo-durata	Solo-fine	Avanzamento
Cardine	Cardine inattiva	Riporto riepilogo manuale	Attività esterne	Avanzamento manuale
Riepilogo	Riepilogo inattiva	Riepilogo manuale	Cardine esterno	
