ID	Modalità attività	Nome attività	Predecessori	Durata
1		**Lavori preparatori**		**60 g**
2		Installazioni di cantiere		25 g
3		Realizzazione drenaggi sotto platea	2	20 g
4		Realizzazione impermeabilizzazioni -6	3	15 g
5		**Costruzione opere grezza edificio e edificio tampone**		**160 g**
6		Realizzazione platea -6	4	10 g
7		Realizzazione elevazioni -6	6	10 g
8		Realizzazione soletta -6	7	15 g
9		Realizzazioni elevazioni -5	8	15 g
10		Realizzazioni soletta -5	9	15 g
11		Realizzazione elevazioni -4	10	15 g
12		Realizzazione soletta -4	11	15 g
13		Realizzazione elevazioni -3	12	15 g
14		Realizzazione soletta -3	13	15 g
15		Posa soletta prefabbricata	13	10 g
16		Realizzazioni elevazioni -2	14	10 g
17		Realizzazione soletta -1	16	10 g
18		Ralizzazione elevazioni -1	17	15 g
19		Realizzazione elevazioni PT	17	10 g
20		Realizzazioni chiusure Lift	19	5 g
21		Realizzazione cunicoli di fuga	17	15 g
22		**Lavori secondari**		**100 g**
23		Realizzazione pareti in muratura	11	100 g
24		Posa isolazioni e impermeabilizzazioni	11	100 g

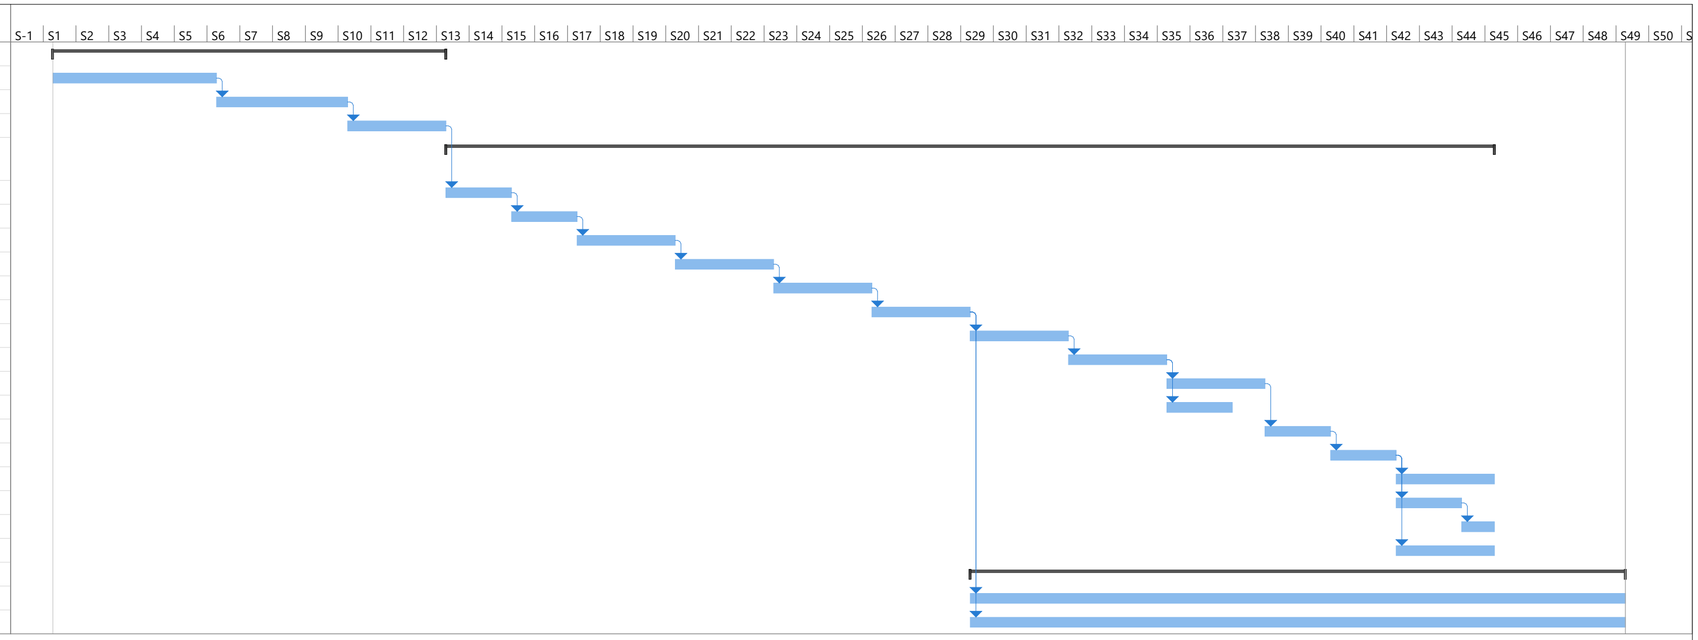

Progetto: Programma lavori
Data: mer 16.09.26

Attività	Riepilogo	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Cardine esterno	Avanzamento manuale
Divisione	Riepilogo progetto	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine	Scadenza	
Cardine	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Attività esterne	Avanzamento	
